



# **Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2017**

**03 de juliol de 2017**

**Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.**

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic

---



## ÍNDEX

1. Valor social de les actuacions d'estiu 2017.
2. Comparatiu obres d'estiu (període 2011 - 2017).
3. Llistat obres del catàleg d'actuacions d'estiu 2017
4. Plànols de les actuacions d'estiu.
5. Fitxes d'actuacions del catàleg d'estiu 2017.
  - a. Urbanitzacions.
  - b. Infraestructures ferroviàries.
  - c. Infraestructures viàries.
  - d. Infraestructures de serveis.
  - e. Actuacions en millora de la mobilitat.
  - f. Actuacions d'iniciativa privada.



## **1. Valor social de les actuacions d'estiu 2017**

---



## VALOR SOCIAL DE LES ACTUACIONS DE L'ESTIU 2017

---

- Actuacions de millora de la qualitat de l'espai públic, dels serveis i de les infraestructures de la ciutat.
- Execució d'obres a l'estiu per aprofitar un escenari de menor mobilitat viària, amb poca activitat docent i esportiva.
- Menys impacte i menys molèsties als veïns i veïnes.
- Obres amb un marcat impacte social que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.
- Finalització de noves urbanitzacions que milloren la qualitat i la mobilitat als barris: Joan Pelegrí, Septimània, Providència i Guineueta.
- Es millora la seguretat viària de les calçades per al transport públic i privat de la xarxa bàsica i local, actuant en les obres de pavimentació de calçades, senyalització i àmbits de carrils d'autobusos.
- Millora de l'accessibilitat i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR) a les xarxes de transport públic col·lectiu, col·locació d'ascensors a les estacions de Putxet, Jaume I i Barceloneta.



## VALOR SOCIAL DE LES ACTUACIONS DE L'ESTIU 2017

---

- Millores en la mobilitat de la ciutat en l'execució de nous carrils bicicleta Josep Carner, Dega Bahí, París – Londres, SAM Claret – Industria – Biscaia, Ganduxer, Sardenya - Ramon Trias Fargas, Rio de Janeiro, Doctor Fleming, Esteve Terrades i Av. Pau Casals.
- Actuacions a la xarxa de bus en millora de nous carrils bus i senyalització.
- Garantir la qualitat dels subministraments urbans: reparacions importants de les xarxes primàries d'aigua potable, elèctriques i gas.
- Millora de la salubritat i del medi ambient i reducció dels riscos d'enfonsament amb actuacions de reparació de la xarxa de clavegueram, reparant col·lectors, com és el cas del carrer Josep Tarradellas, Travessera de Gràcia, pl. Portal de la Pau, reixa de desguàs en el vial d'incorporació Rda. Del Mig (Carrer Sants sentit muntanya) i tapes enfonsades.





## **2. Comparatiu obres d'estiu (període 2011 - 2017)**

---



## Comparatiu del període 2011 al 2017

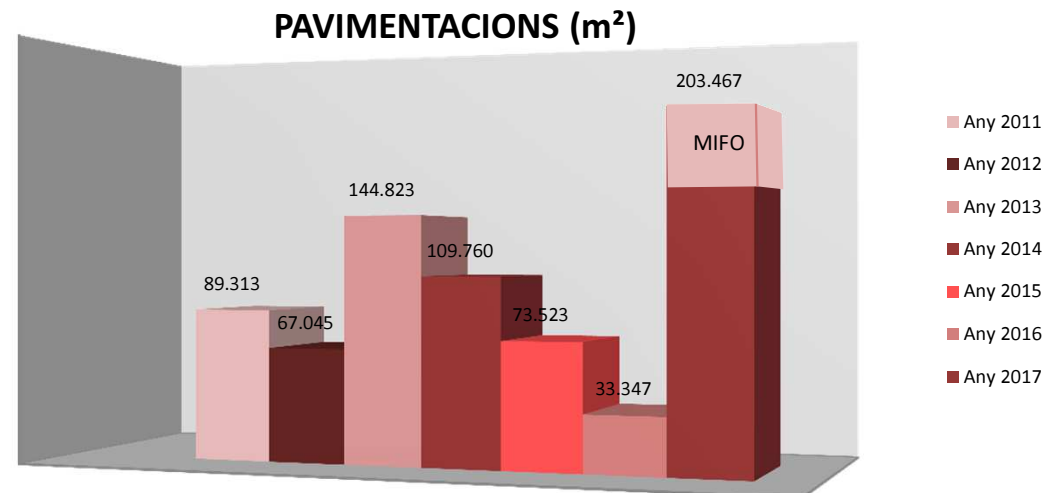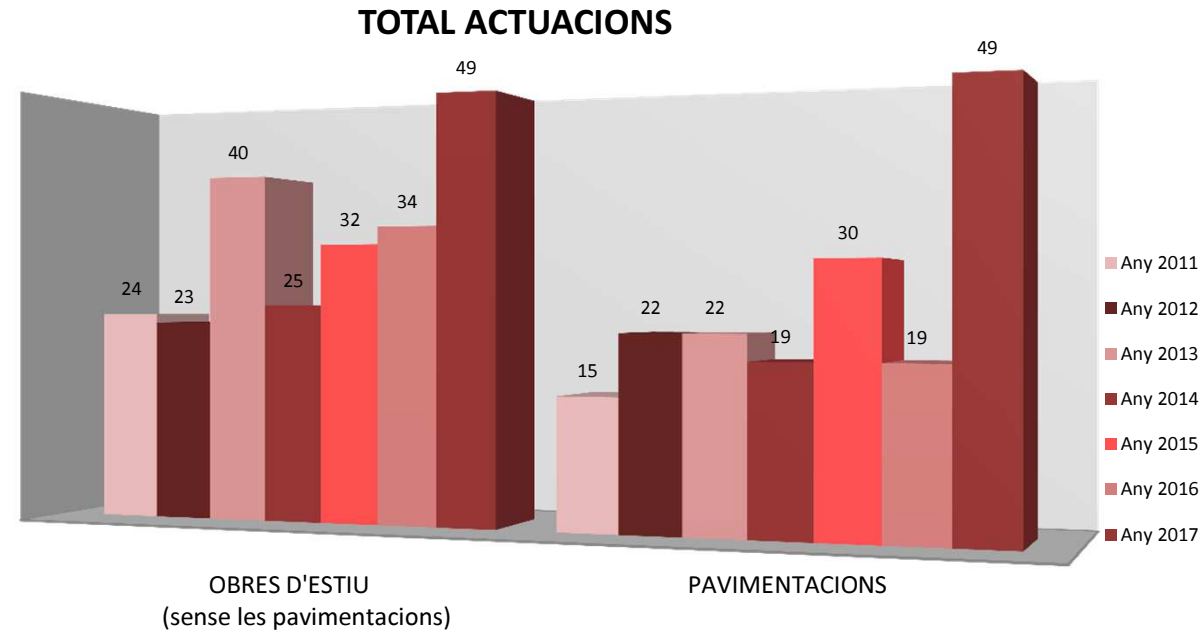

\*Previsió a 26 de juny de 2017  
Inclou 40.273m² d'obra de MIFO



### **3. Llistat obres del catàleg d'actuacions d'estiu 2017**

---





## **A. URBANITZACIONS**

- a.1 Re urbanització eix carrers Sant Frederic, Casteràs i Càceres; Riera d'Escuder i Jocs Florals
- a.2 Millores plaça Joan Pelegrí
- a.3 Re urbanització interior Illa Guineueta
- a.4 Re urbanització carrer Providència, actuació de connexió del clavegueram al carrer Torrent de l'Olla
- a.5 Millores dels entorns del Parc Güell:
  - a. Soterrament aeris Baixada de la Glòria
  - b. Millores dels entorns del Parc Güell. Reparació impermeabilització Pl. Natura
- a.6 Vorera Llobregat av. República Argentina, voreres pg. St. Gervasi i voreres c. Ganduxer
- a.7 Urbanització carrer de Septimània

## **B. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES**

- b.1 Adaptació a PMR estació FGC de Putxet
- b.2 Adaptació a PMR estació FMB L4 de Jaume I
- b.3 Millores en l'accessibilitat a l'accés de l'estació de FMB L4 de Barceloneta
- b.4 Desmuntatge / muntatge d'elements mecànics a l'estació superior del funicular de Vallvidrera

## **C. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES**

### **c.1 Execució d'estructures :**

- c.1.1 Execució d'estructures a la mitjana de la Ronda de Dalt per a cobertura entre el pk 10,5 i 10,7 (Av. Jordà)

### **c.2 Actuacions a les rondes :**

- c.2.1 Neteja de túnels
- c.2.2 Pavimentació Ronda de Dalt (tram C-32/B-20, sentit Besòs des del pk 62+300 (C32) al pk 5+700 (B-20))
- c.2.3 Pavimentació B10 zona Morrot

### **c.3 Pavimentacions ciutat (vies d'accés, xarxa bàsica i local) :**

- c.3.1 Gran Via CC (Plaça Tetuan - Marina)
- c.3.2 Pau Claris (Gran Via CC -plaça Urquinaona)
- c.3.3 Av. Josep Tarradellas, costat mar (París - av. Sarrià)
- c.3.4 Cruïlles Aragó
- c.3.5 Cruïlles Gran Via CC
- c.3.6 Casanova, carril bus (Consell de Cent - Aragó)



- 
- c.3.7 Cruïlla av. Diagonal - Roger de Llúria
  - c.3.8 Bulevard passeig de Sant Joan (Rosselló - av. Diagonal)
  - c.3.9 Parlament
  - c.3.10 Cisell
  - c.3.11 Sant Roc (Gran Via CC - Creu Coberta)
  - c.3.12 Foneria
  - c.3.13 Enric Bargés (Viriat - Numància)
  - c.3.14 Calçada lateral Gran via CC (Mèxic - plaça Espanya)
  - c.3.15 Prunera
  - c.3.16 Anníbal
  - c.3.17 Passos elevats al districte de les Corts
  - c.3.18 Balmes (plaça Joaquim Folguera - plaça Kennedy)
  - c.3.19 Ganduxer (Jacinto Benavente - Gral. Mitre)
  - c.3.20 Ganduxer (Gral. Mitre - passeig Bonanova)
  - c.3.21 Lincoln
  - c.3.22 Palafolls
  - c.3.23 Bulevard central Via Augusta (Bosch - Sèneca)
  - c.3.24 Via Augusta (Trav. Gràcia – av. Diagonal)
  - c.3.25 Bulevard central Via Augusta (Trav. Gràcia - Bosch)
  - c.3.26 Passos elevats al districte de Sarrià - Sant Gervasi
  - c.3.27 Bulevard passeig de Sant Joan (Industria - Rosselló)
  - c.3.28 Carril bus Còrsega (Girona - Bruc)
  - c.3.29 Passeig Vall d'Hebron costat mar (Jorge Manrique - av. de l'Estatut)
  - c.3.30 Garriga i Roca (Nen de la Rutlla - Aguilar)
  - c.3.31 Lloret de Mar (Coimbra - Horta)/ Coimbra
  - c.3.32 Pas elevat Santa Amalia
  - c.3.33 Segur (plaça Isop - Numen Mestre)
  - c.3.34 Llorens i Barba (Padilla - Castillejos)
  - c.3.35 Agudells
  - c.3.36 Moratín
  - c.3.37 Font d'en Fargues
  - c.3.38 Av. Meridiana, sentit Llobregat (Rio de Janeiro - Fabra i Puig)



- c.3.39 Passatge al carrer l'Estudiant
- c.3.40 Turó Trinitat (cruïlla amb Foradada)
- c.3.41 Cinca (Joan Torres - pl. Estació)
- c.3.42 Concepció Arenal (Cardenal Tedeschini - Felip II)
- c.3.43 Av. Meridiana, sentit Besòs (Fabra i Puig - Rio de Janeiro)
- c.3.44 Ciutat d'Elx
- c.3.45 Passeig Enric Sanchis (Sant Adrià - Foc Follet)
- c.3.46 Bilbao (Gran Via CC - Perú)
- c.3.47 Marroc (Bilbao - av. Diagonal)

**c.4 Estructures vials :**

- c.4.1 Supressió de junts de dilatació al passeig de la Vall d'Hebron sobre la Ronda de Dalt, carrers Jericó i Arenys
- c.4.2 Pg. Gràcia / av. Francesc Ferrer i Guàrdia / Aiguablava

**D. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS**

**d.1 Elèctriques :**

- d.1.1 Obra de connexió a av. Paral·lel per a subministrament MT Mercat de Sant Antoni
- d.1.2 Estesa cable 25kW al Carrer Tànger vinculada al desmantellament Estació Elèctrica Poble Nou

**d.2 Aigua potable :**

- d.2.1 Instal·lació de nova vàlvula de d-1000 en canonada de xarxa de transport al carrer Diputació entre Marina i Sardanya
- d.2.2 Instal·lació de nova vàlvula de d-1100 a la canonada de d-1400 del carrer Providència
- d.2.3 Actuacions singulars a la xarxa de distribució

**d.3 Gas :**

- d.3.1 Substitució de vàlvula existent de 16" existent a la xarxa de plaça Espanya front FIRA

**d. 4 Climatització :**

- d.4.1 Escomesa de la xarxa de "Districlima" al tanatori del carrer Almogàvers entre Zamora i Juan d'Àustria
- d.4.2 Escomesa "Ecoenergies" edifici Generalitat carrer Foc - Urani

**d.5 Sanejament :**

- d.5.1 Reparació de la claveguera del carrer Josep Tarradellas entre Rosselló i Còrsega
- d.5.2 Reparació de la claveguera de Travessera de Gràcia entre plaça de Gal·la Plàcidia i carrer Gran de Gràcia
- d.5.3.a Reparació punt baix Josep Anselm Clavé i Pg. Colom (Portal de la Pau)



d.5.3.b Reparació en reixes enfonsades en vial d'incorporació Rda. Del Mig (Carrer Sants sentit muntanya)

d.5.4 Reparació claveguera Rasos de Peguera (Agudes - Antic Camp de Fútbol Ciutat Meridiana)

**d.6 Actuacions coordinades de serveis**

d.6.1 Can Batlló

**E. ACTUACIONS DE MILLORA DE LA MOBILITAT**

**e.1 Execució de carrils bicicleta:**

e.1.1 Josep Carner

e.1.2 París - Londres

e.1.3 Ganduxer

e.1.4 Doctor Fleming

e.1.5 Av. Pau Casals

e.1.6 Esteve Terrades

e.1.7 Rio de Janeiro

e.1.8 Dega Bahí

e.1.9 SAM Claret - Indústria - Biscaia

e.1.10 Sardenya - Ramon Trias Fargas

e.1.11 Finalització carril bici Pujades - av. Meridiana (Pujades - Almogàvers)

**e.2 Nous trams de carril bus:**

e.2.1 València entre Navas de Tolosa i Espronceda

e.2.2 Gran Via CC costat mar, entre Josep Pla i Rambla Prim

e.2.3 Via Augusta (Trav. Gràcia – av. Diagonal)

e.2.4 Pg. De Sant Joan (Trav. Gràcia – Mallorca)

e.2.5 Millores de senyalització a la línia D20

**e.3 Talls de servei de la xarxa ferroviària (a títol informatiu)**

e.3.1 L1: Servei Hospital de Bellvitge - Torres i Bages

e.3.2 L3: Servei Zona Universitària - Vall d'Hebron i Canyelles - Trinitat Nova

e.3.3 L3: Servei Zona Universitària - Lesseps i Vall d'Hebron - Trinitat Nova

**F. ACTUACIONS D'INICIATIVA PRIVADA**

f.1 Execució de pou d'accés en calçada a la mina d'aigua situada al carrer Còrsega 344-352 (Núñez i Navarro)

f.2 Instal·lació de grua de gran tonatge (400T) a Gran Via CC 553, cruïlla amb Casanova (La casa por el Tejado)

f.3 Instal·lació de grua de gran tonatge (400T) a Gran Via CC 504, cruïlla amb Comte Borrell (La casa por el Tejado)



## **4. Plànols de les actuacions d'estiu**


























## PLÀNOL D'ACTUACIONS D'ESTIU 2017

Data d'actualització: 03 / 07 / 2017


Escala de planta general 1 : 40.000 / Escala de detall 1 : 60.000 / Format Din A3

### LLEGENDA

- |   |                                |   |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Urbanització                   |  | Impacte alt / molt alt            |
|  | Edificació                     |  | Afectació de zones comercials     |
|  | Pavimentació                   |  | Afectació de mobilitat / vianants |
|  | Infraestructures del transport |  | Afectació del transport           |
|  | Serveis (tif, gas, elect.)     |  | Zones comercials                  |
|  | PR1                            |   |                                   |
|  | Altres                         |   |                                   |
|  | Verd i BIO                     |   |                                   |
|  | Aturades                       |   |                                   |
|  | Pla Buits - Microubanitzacions |   |                                   |
|  | Enllumenat                     |   |                                   |
|  | Mobilitat                      |   |                                   |
|  | Clavegueram                    |   |                                   |

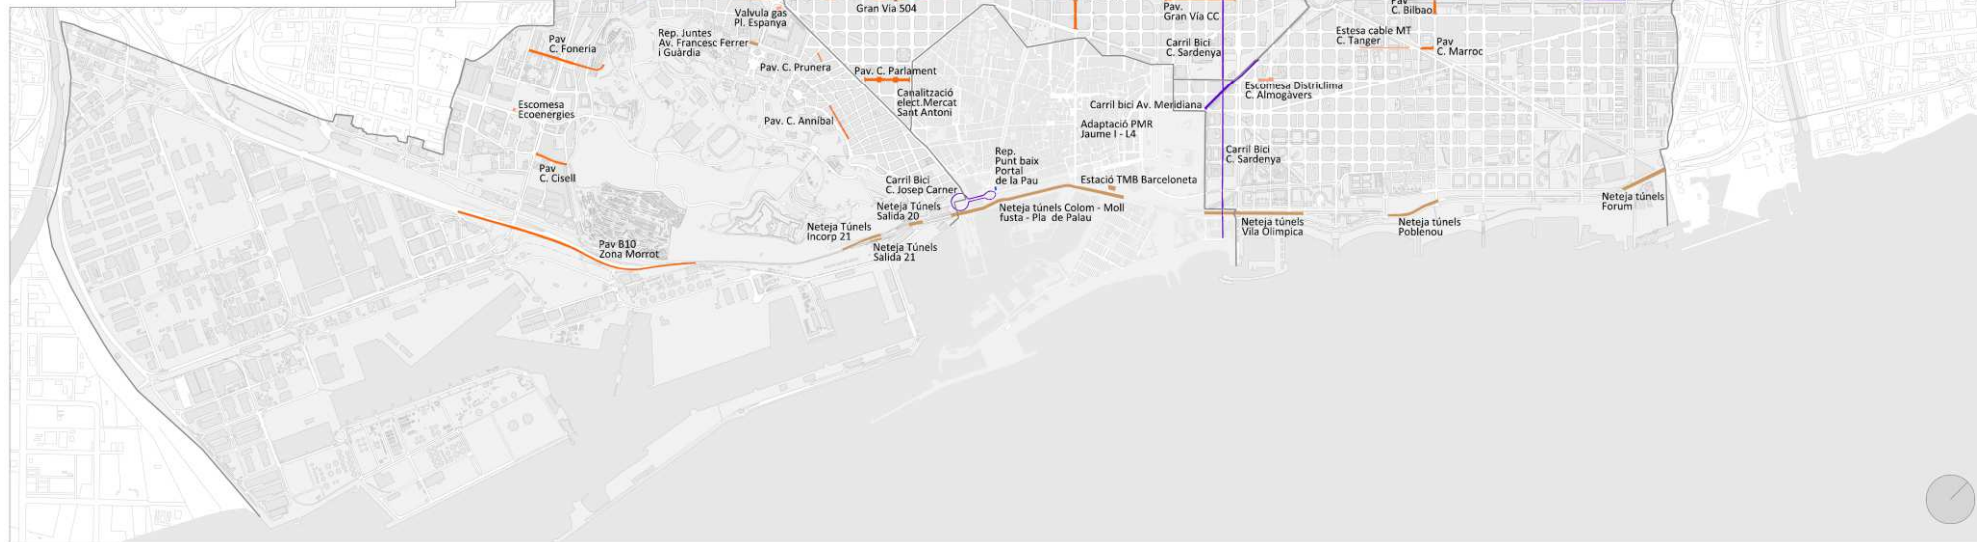



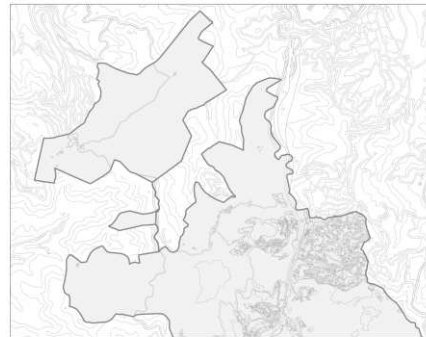

(detall Sarrà Sant Gervasi)



ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT


PLÀNOL D'ACTUACIONS D'ESTIU 2017 AMB OBRES ACTUALS

Data d'actualització: 03 / 07 / 2017

Escala de planta general 1 : 40.000 / Escala de detall 1 : 60.000 / Format Din A3

LLEGENDA

	Urbanització		Impacte alt / molt alt
	Edificació		Afectació de zones comercials
	Pavimentació		Afectació de mobilitat / vianants
	Infraestructures del transport		Afectació del transport
	Serveis (tif, gas, elect.)		Zones comercials
	PR1		
	Altres		
	Verd i BIO		
	Aturades		
	Pla Buits - Microurbanitzacions		
	Enllumenat		
	Mobilitat		
	Clavegueram		

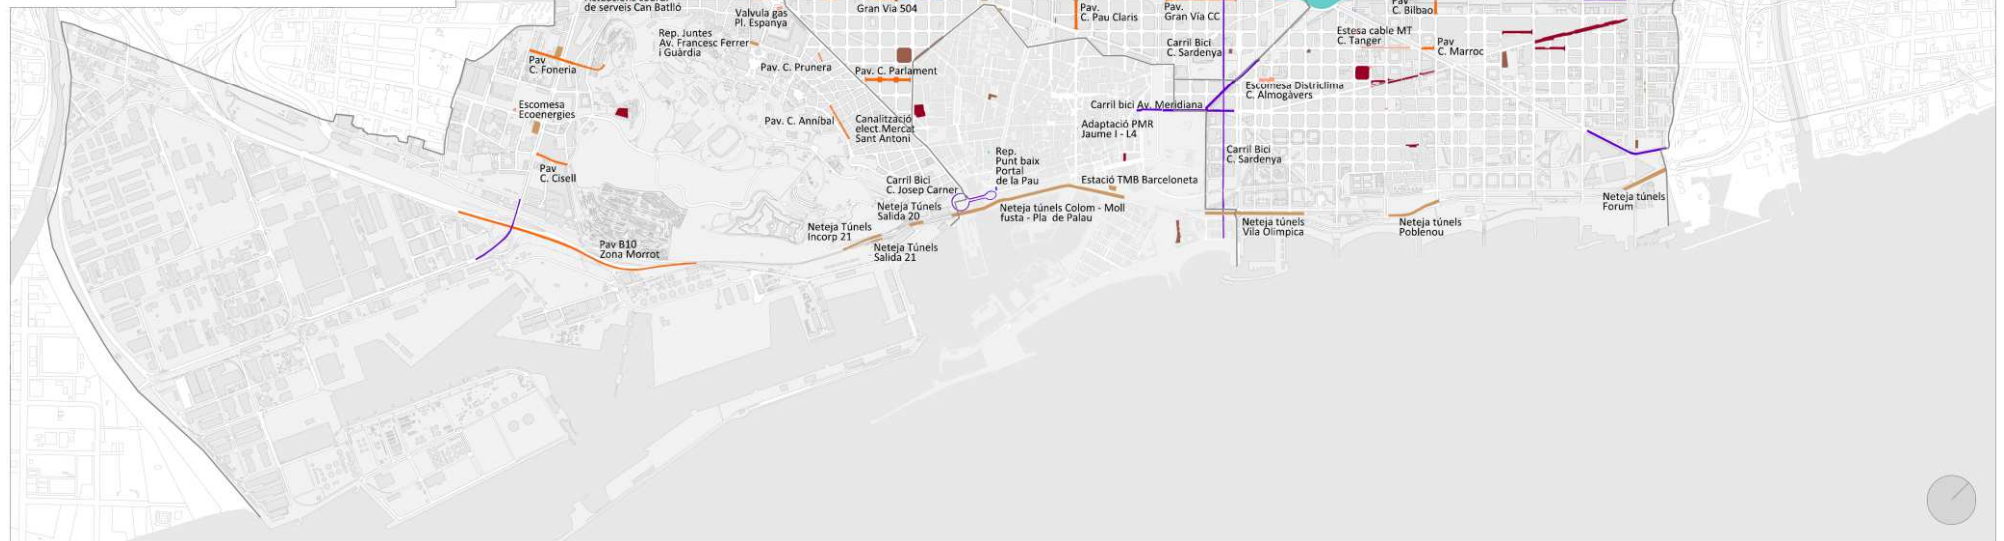



## **5. Fitxes d'actuacions del catàleg d'estiu 2017**

---





## **A. Urbanitzacions**





## ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2017

	a. URBANITZACIONS			JUNY		JULIOL				AGOST					SETEMBRE		
	ACTUACIÓ	INICI	FINAL	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17	18-24
a.1	Re urbanització eix carrers Sant Frederic, Casteràs i Caceres; Riera d'Escuder i Jocs Florals	09/01/17	15/12/17														
a.2	Millores plaça Joan Pelegri	13/03/17	14/08/17														
a.3	Re urbanització interior Illa Guineueta	08/08/16	10/08/17														
a.4	Re urbanització carrer Providència, actuació de connexió del clavegueram al carrer Torrent de l'Olla	25/08/16	28/07/17														
a.5.a	Millores dels entorns del Parc Güell. Soterrament aeris Bda. Glòria	19/06/17	25/08/17														
a.5.b	Millores dels entorns del Parc Güell. Reparació imperme. Pl. Natura	19/07/17	19/05/18														
a.6	Vorera Llobregat av. República Argentina, voreres pg. St. Gervasi i voreres c. Ganduxer	26/06/17	30/08/17														
a.7	Urbanització carrer de Septimània	16/01/17	31/07/17														

## PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

## DISTRICTE

SANTS - MONTJUÏC

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Re urbanització de l'eix Sant Frederic, Casteràs i Càceres (fins a c. Sant Medir), el c. Riera d'Escuder (Sants - Daoiz i Velarde) i c. Jocs Florals (Sants - Antoni Capmany).

L'objectiu principal és completar la re urbanització executada dels entorns del Mercat de Sants i els carrers Canalejas, Daoiz i Velarde i Antoni Capmany, per millorar l'accessibilitat a tot l'àmbit.

L'actuació engloba l'execució d'afectacions de serveis, nous fermes, jardineria, drenatge superficial i elements d'urbanització diversos, a més de renovar la xarxa d'enllumenat, nova xarxa de reg, nova xarxa IMI, adequació de la xarxa de clavegueram a la nova situació urbanística, execució de 3 nous col·lectors, i soterrament dels serveis aeris existents.

## ACTUACIÓ D'ESTIU

- Urbanització del carrer Jocs Florals entre carrer de Sants i Antoni Capmany.
- Urbanització del tram del carrer Casteràs entre Begur i Badal afectant el creuament de Begur.
- Urbanització del carrer Càceres entre Badal i Tinent Flomesta.
- Continuació de la urbanització als tram de St. Frederic entre Carreras Candi i Begur quan finalitzin les tasques d'arqueologia (refugi de la Guerra Civil).



## AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Durant els treballs es tallaran els trams de carrer permetent la permeabilitat dels carrers transversal, excepte en els carrers Begur i Feliu Casanova que quedaran en atzucac.

Foto tram finalitzat entre Riera Blanca i Carreras Candi  
Xamfrà St. Frederic – Riera Blanca.



## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

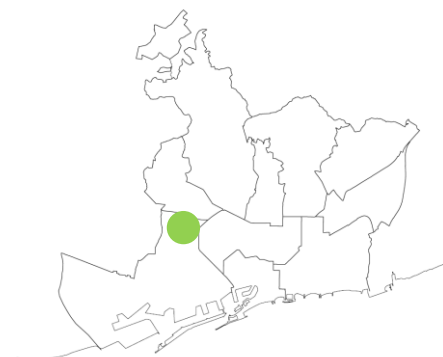

## Fases d'obra

- Tram finalitzat
- Tram actualment en execució
- Tram obra inici a l'estiu
- Tram pendent execució (inici setembre)

[illegible]



## PROMOTOR

## DISTRICTE

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

## ACTUACIÓ D'ESTIU

L'accès des del c. Miquel Bleach es farà per un pas de 2m d'amplada.


## AFECTION A LA CIUTAT

No hi ha afectació al trànsit de vehicles.

L'actuació es desenvoluparà a l'interior de la plaça.



Obra implantada



Àmbit d'obra

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]





### a.3 Urbanització dels interiors d'illa. Guineueta

Obra d'estiu Fi

**Obra implantada**

Foto estat actual urbanització interior d'illa Guineueta




- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]

<b>PROMOTOR</b>	AJUNTAMENT DE BARCELONA
<b>DISTRICTE</b>	GRÀCIA
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Treballs per a la substitució de la claveguera del carrer Providència - Biada entre els carrers Rabassa i Torrent de l'Olla, de secció NT83 i de més de 70 anys d'antiguitat, per una nova claveguera tubular de material plàstic. També es contempla la reposició dels embornals i claveguerons de les finques fins a la línia de façana i la demolició i la reposició de la totalitat de la caixa de paviment dins l'àmbit de l'obra, i la demolició i reposició de les vorades, voreres i guals afectats per l'execució de la nova xarxa de clavegueram.
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	Treballs de connexió del col·lector de l'eix dels carrers Providència - Biada amb l'existent a Torrent de l'Olla. <b>Del 26 de juny al 14 de juliol del 2017.</b> Estesa de la capa de rodadura de l'eix del carrer Providència – Biada entre Rabassa i Torrent de l'Olla. <b>El 28 de juliol del 2017.</b>
<b>AFFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	Els treballs de connexió es faran amb tall total de Torrent de l'Olla amb Biada, aprofitant les obres d'Agbar de instal·lació de la nova vàlvula de D1100 a la canonada de D1400 a Torrent de l'Olla. El desviament alternatiu serà per Bellver – Verdi – Robí. Es garantirà l'accés als parkings de Torrent de l'Olla.

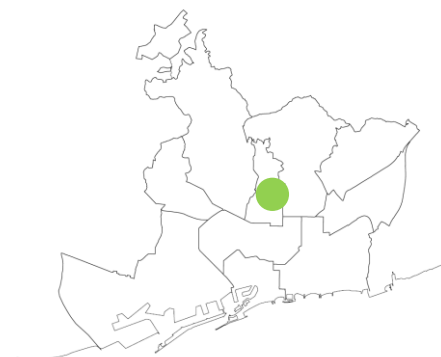

Inici

Obra d'estiu Fi

**Obra implantada**

Foto tram finalitzat pendent capa rodadura  
Tram Rabassa - Massens



## Connexió col·lector



### Àmbit de pavimentació

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]





## PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

## DISTRICTE

# GRÀCIA

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

### Soterrament aeris del carrer Baixada de la Glòria

Treballs consistents en el soterrament de les línies aèries existents, d'enllumenat i subministrament elèctric, al carrer Baixada de la Glòria entre els carrers Verdi i Mare de Déu del Coll, i en el creuament de calçada del c. Sostres.

## ACTUACIÓ D'ESTIU


Es programen els treballs en dues fases, en dos trams completament diferenciats:

**Fase1.** Tram del carrer entre Mare de Déu del Coll i Repartidor. (19/06-22/07)

**Fase 2. Tram del carrer entre els carrers Repartidor i Verdi. (24/07-25/08)**

## AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Els treballs es faran en dues fases mantenint la circulació en tot moment en el carrer Baixada de la Glòria. El soterrament es farà a la zona del carril d'estacionament i s'afectaran els creuaments amb els carrers Mare de Déu del Coll, ptge. Espíria, Repartidor, Verdi i el carrer Sostres per meitats de calçada.

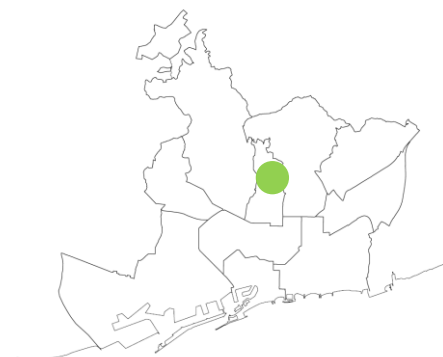

Inici

Obra d'estiu

Fi

**Obra implantada**

## Fases d'obra

■ Fase 1 (19/06-22/07)


Fase 2 (24/07-25/08)

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



## Reparació de la impermeabilització i recollida d'aigües de la plaça de la Natura



## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]





## DISTRICTE

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

- la vorera Llobregat de l'avinguda República Argentina (Caire - Claudi Sabadell).
- vorera mar i muntanya del pg. De Sant Gervasi (Teodora Lamadrid i Folgueroles).
- vorera Llobregat del c. Ganduxer (Jacinto Benavente – Les Tres Torres).

Els treballs inclouen el canvi de la vorada, la rigola i la base en tot els trams

## ACTUACIÓ D'ESTIU

Avinguda República Argentina: del 26 de juny al 28 d'agost.

**Pg. De Sant Gervasi: del 17 de juliol al 22 d'agost.**


C. Ganduxer: del 24 de juliol a 30 d'agost del 2017.

## AFFECTACIÓ A LA CIUTAT

Avinguda República Argentina: actuació en 3 fases mantenint mínim un carril per sentit.

Pg. De Sant Gervasi: actuació a les dues voreres a la vegada mantenint un carril per sentit.

C. Ganduxer: actuació als dos trams a la vegada ocupant calçada i mantenint dos carrils de circulació i sense afectar el carril del costat Besòs (de servei o Bus segons tram).

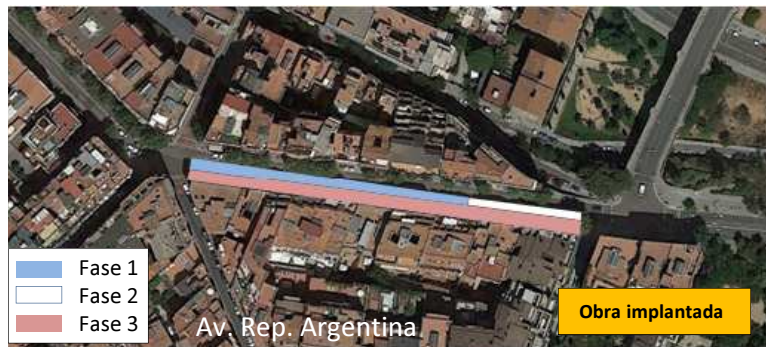

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



## PROMOTOR


## DISTRICTE

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

## ACTUACIÓ D'ESTIU

Treballs de connexió d'embornal al carril lent sentit Besòs de ronda General Mitre. (01/07/17)  
Modificació de l'entroncament de vorades i rigola del c. St. Magí a la calçada lateral. (del 03 al 07/07/17)

## AFFECTACIÓ A LA CIUTAT

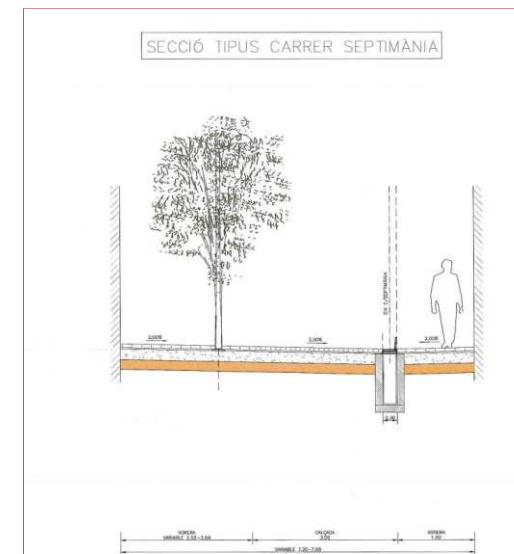

## Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



## **B. Infraestructures ferroviàries**

---





## ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2017

	b. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES			JUNY		JULIOL				AGOST				SETEMBRE		
	ACTUACIÓ	INICI	FINAL	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17
b.1	Adaptació a PMR estació FGC de Putxet	23/05/16	31/07/17													
b.2	Adaptació a PMR estació FMB L4 de Jaume I	08/06/17	15/04/19													
b.3	Milliores en l'accessibilitat a l'accés de l'estació de FMB L4 de Barceloneta	09/01/17	30/07/17													
b.4	Desmuntatge / muntatge d'elements mecànics a l'estació superior del funicular de Vallvidrera	04/08/17	16/08/17													







<b>PROMOTOR</b>	INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
<b>DISTRICTE</b>	CIUTAT VELLA
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Adaptació de la infraestructura a persones amb mobilitat reduïda. L'actuació consisteix en la instal·lació de dos ascensors que comunicaran el nivell de carrer amb el de vestíbul / andana (un a la plaça de l'Àngel i l'altre a Via laietana / Argenteria), i la remodelació de l'accés costat Besòs reorientant-lo cap al carrer Argenteria. També s'inclouen altres reformes internes de l'estació.
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	Desviament de serveis a l'àmbit del nou accés del c. Argenteria.
<b>AFFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	Durant els treballs a la Fase 1A i Fase 1B (desviaments de serveis) es manté el pas de vianants per la vorera i es talla la circulació de Via Laietana – Argenteria. A la subfase F1A' es tallarà la vorera Besòs de Via Laietana desviant vianants per calçada. Es mantindran dos carrils de circulació en sentit muntanya i s'eliminarà provisionalment el gir cap a pl. St. Jaume desviant el trànsit per pl. Antoni Maura.

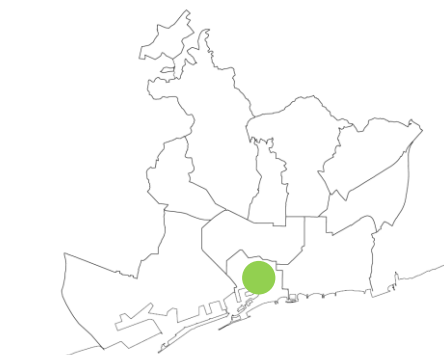


**FASE 1A(08/06/2017 – 25/07/2017) FASE 1B 26/07/2017 – 22/09/2017**

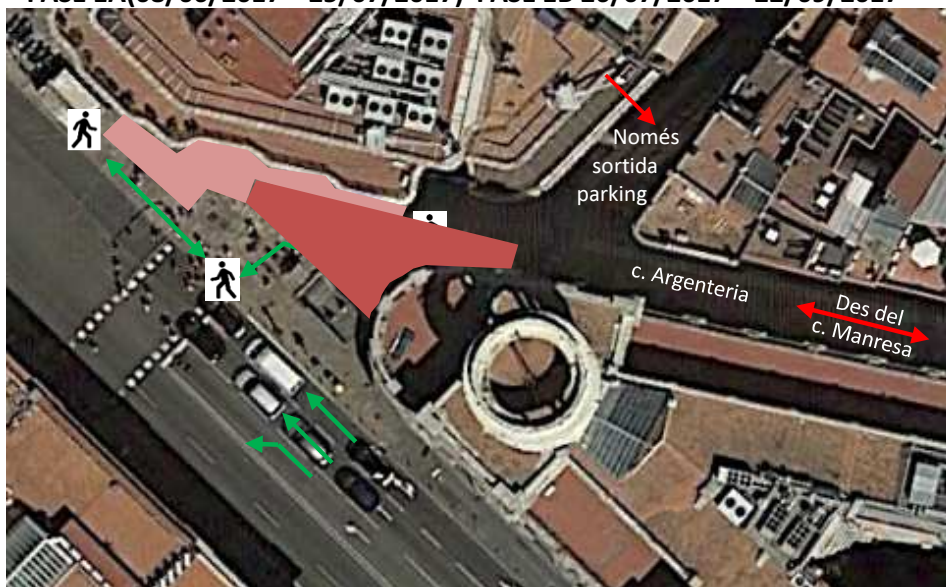

**FASE 1A' 12/07/2017 – 25/07/2017**

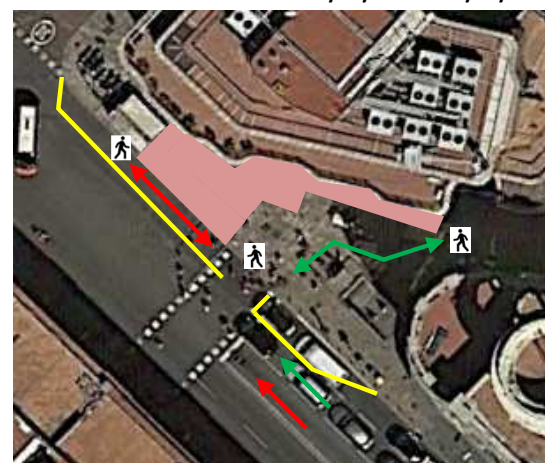

F1A' Accés provisional a pl. St.  
Jaume per pl. Antoni Maura

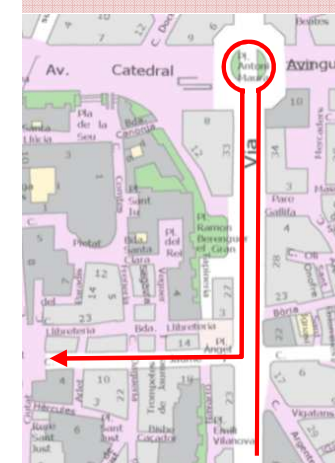

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]

[illegible]



#### **b.4 Desmuntatge / muntatge d'elements mecànics a l'estació superior del funicular de Vallvidrera**

## PROMOTOR

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA METROPOLITÀ DE BARCELONA

DISTRICTE

SARRIÀ – SANT GERVASI

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

L'any 2016 es va detectar un desajustament en la unió de la contrapolitja amb el rodament a l'estació motriu (Estació Superior) del funicular de Vallvidrera. Provisionalment, es va poder solucionar amb una actuació d'urgència que ha permès mantenir el servei del funicular dins dels paràmetres de seguretat.


D'altra banda, d'acord al pla de manteniment cal realitzar una rehabilitació complerta del reductor per canviar els rodaments donat que han superat la vida útil de funcionament prevista. Per efectuar aquestes actuacions en condicions de seguretat, cal extreure els components, fer les actuacions de manteniment/rehabilitació a taller i tornar-los a introduir de nou.

## ACTUACIÓ D'ESTIU

Els equips s'extreuen i s'introdueixen a l'estació a través d'una maniobra d'aixecament mitjançant una grua dimensionada i ubicada al c. de les Alberes i envaint l'accés a l'aparcament de l'edifici número 16.

## AFECTION A LA CIUTAT

Tall del trànsit de vehicles i el pas de vianants a la zona de treball al c. de les Alberes durant els dos dies previstos de l'execució. La zona quedarà balisada i senyalitzada des de l'inici de l'operativa fins a la finalització. Durant l'operació de posicionament i hissat dels elements, es permetrà el pas de vehicles pel carril habilitat del c. de les Alberes. Durant l'operació de posicionament de les càrregues als camions de transport, el pas de vehicles quedarà tallat. En aquest període el funicular quedarà fora de servei.

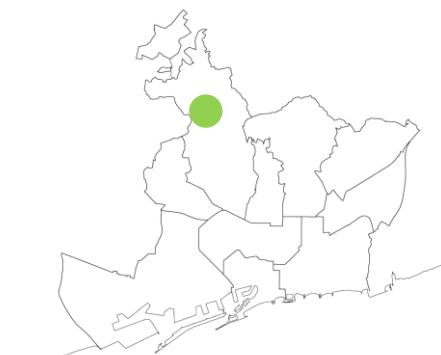

Inici

Obra d'estiu

Fi



## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]





## **C. Infraestructures viàries**

---



## ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2017

	c. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES			JUNY		JULIOL				AGOST				SETEMBRE		
	ACTUACIÓ	INICI	FINAL	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17
c.1	EXECUCIÓ D'ESTRUCTURES															
c.1.1	Execució d'estructures a la mitjana de la Ronda de Dalt per a cobertura entre el pk 10,5 i 10,7 (Av. Jordà)	23/07/17	09/09/17													
c.2	ACTUACIONS A LES RONDES															
C.2.1	Neteja de túnels	26/06/17	25/07/17													
C.2.2	Pavimentació Ronda de Dalt Pavimentació Ronda de Dalt (tram C-32/B-20, sentit Besòs des de el pk 62+300 (C32) al pk 5+700 (B-20))	19/08/17	20/08/17													
c.2.3	Pavimentació B10 zona Morrot	04/08/17	13/08/17													
c.3	PAVIMENTACIONS CIUTAT (VIES D'ACCÉS, XARXA BÀSICA I LOCAL)															
c.4	ESTRUCTURES VIALS															
c.4.1	Supressió de junts de dilatació al passeig de la Vall d'Hebron sobre la Ronda de Dalt, carrers Jericó i Arenys	06/06/17	21/07/17													
c.4.2	Reparació de juntes de paviment al Pg. Gràcia / Av. Francesc Ferrer i Guàrdia / Aiguablava	26/06/17	16/07/17													



## **C.1 Execució d'estructures**





<b>PROMOTOR</b>	AJUNTAMENT DE BARCELONA
<b>DISTRICTE</b>	HORTA - GUINARDÓ
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Obra civil dels elements de suport de la futura cobertura situats a la mitjana de la Ronda de Dalt entre el pk 10,5 i 10,7 (Av. Jordà.) Els treballs consisteixen en la construcció de l'estructura (fonamentació i mur) necessària per a la cobertura de la Fase 1A corresponents a 195m de zona coberta.
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	Obra civil dels elements de suport situats a la mitjana de la Ronda de Dalt consistents en execució de pantalles, encepats d'1m de cantell, alçats de les piles (18 piles de 1.5x0.9m) i alçat del mur (28m x 0.8m).
<b>AFFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	Actuació pendent programar en el Comitè OM.

Inici	Obra d'estiu	Fi
-------	--------------	----



## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



## **C.2 Actuacions a les rondes**







### c.2.1 Neteja de túnels

A map of the Iberian Peninsula (Spain and Portugal) with a green dot indicating the study area in central Spain, specifically in the region of Castile and León.



## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



NETEJA DE TÚNELS DE LES RONDES DE BARCELONA						
DATA EXECUCIÓ	RONDA	TÚNEL	SENTIT	TIPUS DE TALL	TREBALLS A REALITZAR	OBSERVACIONS
26-jun	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 i 23 tallada
27-jun	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besòs, incl. 20 tallada
28-jun	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besòs, incl. 20 tallada
	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 i 23 tallada
29-jun	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besòs, incl. 20 tallada
	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 i 23 tallada
2-jul	B-20	Collserola - Museu - Borràs	Llobregat	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	B-20	Collserola - Museu - Borràs	Besòs	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
3-jul	B-20	Collserola - Museu - Borràs - Oreneta	Llobregat	Ràpid + Central	Neteja de sostres	Tall ordinari
	B-20	Collserola - Museu - Borràs - Oreneta	Besòs	Ràpid + Central	Neteja de sostres	Tall ordinari
4-jul	B-20	Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador	Llobregat	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
5-jul	B-20	Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador	Besòs	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
6-jul	B-20	Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador	Llobregat	Ràpid + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	B-20	Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador	Besòs	Ràpid + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
9-jul	B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Besòs	Lent+Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	B-20 a B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Llobregat	Lent	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	C-58 a B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Llobregat	Lent	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
10-jul	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja mitjanera	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 tallada
	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau, Vila Olímpica	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja mitjanera	Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 23 Besòs, incl. 20 i 22 tallades
11-jul	B-10	Vila Olímpica - Poblenou	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja mitjanera	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besòs, incl. 22 i 23 tallades
	B-10	Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja mitjanera	Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 23 tallada
12-jul	B-10	Poblenou - Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja hastials	Desviament de tràfic per sortida núm. 24 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 24 i 23 tallades pels mossos d'esquadra
	B-10	Vila Olímpica - Poblenou	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja mitjera	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besòs, incl. 22 i 23 tallades
13-jul	B-10	Poblenou - Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja hastials	Desviament de tràfic per sortida núm. 24 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 24 tallades pels mossos d'esquadra
		Vila Olímpica - Poblenou	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja mitjera	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besòs, incl. 22 i 23 tallades
16-jul	B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Llobregat	Carril ràpid	Neteja d'hastials i sostres	Tall de carril Ràpid
	B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Besòs	Carril ràpid	Neteja d'hastials i sostres	Tall de carril Ràpid mossos d'esquadra
17-jul	B-10	Poble nou, Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials	Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 incl.24 i 23 tallades pels mossos d'esquadra
	B-10	Poble nou - Fòrum	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials	Desviament per sortida núm. 23, incorporació per entrada núm. 24 Besòs incl. 23 tallada
18-jul	B-10	Poble nou, Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials	Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 incl.24 i 23 tallades pels mossos d'esquadra
		Poble nou - Fòrum	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials	Desviament per sortida núm. 23, incorporació per entrada núm. 24 Besòs incl. 23 tallada
19-jul	B-20 / C-32	Thau - Cervantes - Can Clota - MMEE	Llobregat	Carril lent i central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	C-32 / B-20		Besòs			Tall ordinari
20-jul	B-20	Thau - Cervantes - Can Clota - MMEE	Llobregat	Carril lent i ràpid	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
			Besòs			Tall ordinari
23-jul	B-20	Oreneta	Llobregat	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	B-20	Oreneta	Besòs	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall de carril Ràpid
24-jul	NUS	Nus de la trinitat	Llobregat	Lent / Ràpid	Neteja d'hastials	Tall de carril Ràpid i tall de carril Lent. Tràfic per carrils centrals
	B-20	Sortida 1	Besòs	Sortida	Neteja d'hastials	Tall sortida 1
	B-20	Incorporació 7	Besòs	Incorporació	Neteja d'hastials i sostres	Tall incorporació 7
	B-20	Incorporació 21	Llobregat	Incorporació	Neteja d'hastials i sostres	Tall incorporació 21
	B-20	Sortida 20	Llobregat	Sortida	Neteja d'hastials	Tall sortida 20
	B-20	Sortida 21	Besòs	Sortida	Neteja d'hastials	Tall sortida 21



### c.2.2 Pavimentació Ronda de Dalt (tram C-32/B-20, sentit Besòs des de el pk 62+300 (C32) al pk 5+700 (B-20))

A map of the Balearic Islands, with a green dot marking the location of Mallorca.

[illegible]





## PROMOTOR

MINISTERIO DE FOMENTO

## DISTRICTE

## SANTS - MONTJUÏC

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Rehabilitació superficial i puntualment d'estructura del ferm dels dos sentits de circulació de la B-10 entre els pk12+000 i pk14+000, des de la sortida 14 en sentit Besòs fins l'entrada 12 en sentit Llobregat.

## ACTUACIÓ D'ESTIU


Es programa l'actuació de rehabilitació del ferm dels dos sentits de circulació de la B-10, des de les 23h del divendres fins les 12h del diumenge.

## AFFECTACIÓ A LA CIUTAT

Es planifica l'actuació en dues fases, una per sentir:

**Fase 1.** Treballs al sentit Besòs amb tall total, desviant la circulació sentit Besòs per l'interior del Port. **Del 04 al 06 d'agost.**

**Fase2.** Treballs al sentit Llobregat, amb tall total, desviant la circulació sentit Llobregat per la calçada Besòs, i desviant el sentit Besòs per l'interior del Port. **Del 11 al 13 d'agost.**

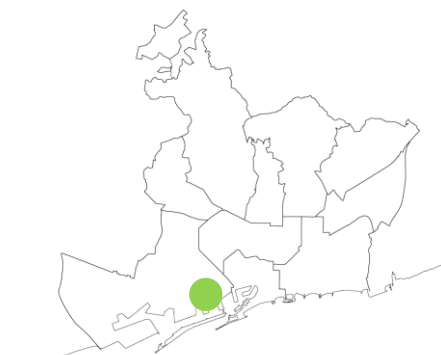

Inici

Obra d'estiu

Fi



## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



## **C.3 Pavimentacions ciutat (vies d'accés, xarxa bàsica i local)**

---



## ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2017

c.2 ACTUACIONS A LES RONDES					
	ACTUACIÓ	DISTRICTE	INICI	FINAL	SUPERFÍCIE (m²)
c.2.2	Pavimentació Ronda de Dalt (tram C-32/B-20, sentit Besòs des de el pk 62+300 (C32) al pk 5+700 (B-20))	Eixample	19/08/2017	20/08/2017	18.000
c.2.3	Pavimentació B10 zona Morrot	Eixample	04/08/2017	13/08/2017	40.273
c.3 PAVIMENTACIONS CIUTAT (VIES D'ACCÉS, XARXA BÀSICA I LOCAL)					
	ACTUACIÓ	DISTRICTE	INICI	FINAL	SUPERFÍCIE (m²)
c.3.1	Gran Via CC (Plaça Tetuan-Marina)	Eixample			8.109
c.3.2	Pau Claris (Gran Via CC-plaça Urquinaona)	Eixample	06/07/2017	09/07/2017	3.648
c.3.3	av. Josep Tarradellas, costat mar (Paris-av. Sarrià) <b>OBRA IMPLANTADA</b>	Eixample	26/06/2017	09/07/2017	4.974
c.3.4	Cruïlles Aragó <b>OBRA FINALITZADA</b>	Eixample	01/07/2017	02/07/2017	1.430
c.3.5	Cruïlles Gran Via CC	Eixample	08/07/2017	09/07/2017	925
c.3.6	Casanova, carril bus (Consell de Cent-Aragó)	Eixample	29/07/2017	30/07/2017	300
c.3.7	Cruïlla Diagonal-Roger de Llúria <b>OBRA FINALITZADA</b>	Eixample	01/07/2017	02/07/2017	1.046
c.3.8	Bulevard passeig de Sant Joan (Rosselló-av.Diagonal)	Eixample	10/07/2017	15/07/2017	3.184
c.3.9	Parlament	Eixample	04/09/2017	17/09/2017	4.800
c.3.10	Cisell	Sants-Montjuïc	01/09/2017	02/09/2017	3.200
c.3.11	Sant Roc (Gran Via CC-Creu Coberta)	Sants-Montjuïc	22/07/2017	23/07/2017	1.670
c.3.12	Foneria	Sants-Montjuïc	01/09/2017	03/09/2017	1.985
c.3.13	Enric Bargés (Viriat-Numància)	Sants-Montjuïc	07/08/2017	08/08/2017	1.976
c.3.14	Calçada lateral Gran via CC (Mèxic-plaça Espanya)	Sants-Montjuïc	08/08/2017	20/08/2017	867
c.3.15	Prunera	Sants-Montjuïc	05/09/2017	05/09/2017	465
c.3.16	Anníbal	Sants-Montjuïc	06/09/2017	06/09/2017	335
c.3.17	Passos elevats al districte de les Corts	Les Corts			350
c.3.18	Balmes (plaça Joaquim Folguera-plaça Kennedy)	Sarrià-Sant Gervasi	03/07/2017	16/07/2017	6.135
c.3.19	Ganduxer (Jacinto Benavente-Gral. Mitre)	Sarrià-Sant Gervasi			4.992
c.3.20	Ganduxer (Gral. Mitre-passeig Bonanova)	Sarrià-Sant Gervasi			6.883
c.3.21	Lincoln <b>OBRA FINALITZADA</b>	Sarrià-Sant Gervasi	26/06/2017	27/06/2017	975
c.3.22	Palafolls	Sarrià-Sant Gervasi	03/07/2017	06/07/2017	1.015
c.3.23	Bulevard central Via Augusta (Trav. Gràcia - Bosch) <b>OBRA IMPLANTADA</b>	Sarrià-Sant Gervasi	26/06/2017	07/07/2017	1.080
c.3.24	Passos elevats al districte de Sarrià - Sant Gervasi	Sarrià-Sant Gervasi	25/07/2017	24/08/2017	377
c.3.25	Via Augusta (Trav. Gràcia - av. Diagonal)	Sarrià-Sant Gervasi			3.000
c.3.26	Bulevard central Via Augusta (Bosch-Séneca)	Gràcia	06/07/2017	14/07/2017	750
c.3.27	Bulevard passeig de Sant Joan (Indústria-Rosselló)	Gràcia	03/07/2017	08/07/2017	4.100
c.3.28	Carril bus Còrsega (Girona - Bruc)	Gràcia			750
c.3.29	Passeig Vall d'Hebron costat mar (Jorge Manrique-av. de l'Estatut) <b>OBRA FINALITZADA</b>	Horta-Guinardó	01/06/2017	04/06/2017	5.309
c.3.30	Garriga i Roca (Nen de la Rutlla-Aguilar)	Horta-Guinardó			3.910
c.3.31	Lloret de Mar (Coimbra-Horta)/ Coimbra	Horta-Guinardó	24/07/2017	26/07/2017	1.600
c.3.32	Pas elevat Santa Amalia	Horta-Guinardó	07/08/2017	11/08/2017	80
c.3.33	Segur (plaça Isop-Numen Mestre)	Horta-Guinardó	17/07/2017	21/07/2017	1.050
c.3.34	Llorens i Barba (Padilla-Castillejos)	Horta-Guinardó	31/07/2017	01/08/2017	650
c.3.35	Agudells	Horta-Guinardó	02/08/2017	03/08/2017	640
c.3.36	Moratin	Horta-Guinardó			849
c.3.37	Font d'en Fargues	Horta-Guinardó			1.675
c.3.38	av. Meridiana, sentit Llobregat (Rio de Janeiro-Fabra i Puig)	Nou Barris			24.796
c.3.39	passatge al carrer l'Estudiant	Nou Barris	25/07/2017	25/07/2017	475
c.3.40	Turó Trinitat (cruïlla amb Foradada)	Sant Andreu			650
c.3.41	Cinca (Joan Torres - pl. Estació)	Sant Andreu			1.440
c.3.42	Concepció Arenal (Cardenal Tedeschini - Felip II)	Sant Andreu			3.000
c.3.43	av. Meridiana, sentit Besòs (Fabra i Puig-Rio de Janeiro)	Sant Andreu			21.604
c.3.44	Ciutat d'Elx <b>OBRA FINALITZADA</b>	Sant Andreu	26/06/2017	27/06/2017	4.500
c.3.45	passeig Enric Sanchis (Sant Adrià-Foc Follet) <b>OBRA FINALITZADA</b>	Sant Andreu	28/06/2017	01/07/2017	1.560
c.3.46	Bilbao (Gran Via CC-Perú)	Sant Martí	15/07/2017	16/07/2017	1.260
c.3.47	Marroc (Bilbao-av.Diagonal)	Sant Martí	15/07/2017	16/07/2017	825
SUPERFÍCIE					203.467





## **C.4 Estructures vials**





[illegible]

<b>PROMOTOR</b>	AJUNTAMENT DE BARCELONA
<b>DISTRICTE</b>	EIXAMPLE / SANTS – MONTJÜIC / NOU BARRIS
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Treballs de reparació de juntes a 3 localitzacions: Pg. De Gràcia (Gran Via - Aragó) Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (Mèxic – av. Reina M <sup>a</sup> Cristina) Aiguablava (Fenals – de la Fosca)
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	Pg. de Gràcia reparació de 15 juntes. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia reparació de 4 juntes. Aiguablava reparació de 3 juntes transversal i 1 longitudinal.
<b>AFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	Pg. De Gràcia: treballs en 3 caps de setmana, per meitats de calçada, mantenint mínim un carril de circulació per sentit. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia: treballs en una nit de les 21h fins les 07h, mantenint mínim un carril de circulació amb pas alternatiu. Aiguablava: treballs en dos dies per meitats de calçada, cal retirar estacionament dels dos costat i mantenir un carril de circulació per sentit.

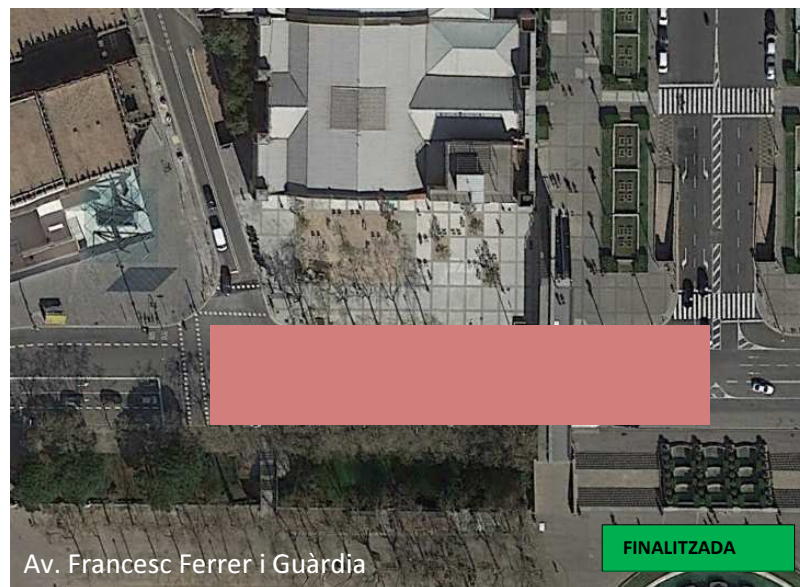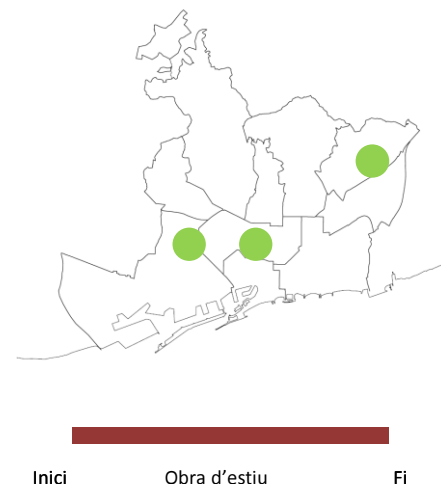

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



## **D. Infraestructures de serveis**

---



## ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2017

d. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS				JUNY		JULIOL				AGOST				SETEMBRE			
ACTUACIÓ		INICI	FINAL	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17	11-17
<b>d.1</b>	<b>ELÈCTRIQUES</b>																
d.1.1	Obra de connexió a av. Paral·lel per a subministrament MT Mercat de Sant Antoni	12/08/17	19/08/17														
d.1.2	Esteça cable 25kW al Carrer Tànger vinculada desmantellament Estació Elèctrica Poble Nou	08/07/17	09/07/17														
<b>d.2</b>	<b>AIGUA POTABLE</b>																
d.2.1	Instal·lació de nova vàlvula de d-1000 en canonada de xarxa de transport al carrer Diputació entre Marina i Sardenya	12/06/17	14/07/17														
d.2.2	Instal·lació de nova vàlvula de d-1100 a la canonada de d-1400 del carrer Providència (pendent de determinació)	26/06/17	27/07/17														
d.2.3	Actuacions singulars a la xarxa de distribució	03/07/17	01/09/17														
<b>d.3</b>	<b>GAS</b>																
d.3.1	Substitució de vàlvula existent de 16" existent a la xarxa de plaça Espanya front FIRA	26/06/17	11/08/17														
<b>d.4</b>	<b>CLIMATITZACIÓ</b>																
d.4.1	Escomesa de la xarxa de "Districlima" al tanatori del carrer Almogàvers entre Zamora i Juan d'Austria	27/06/17	08/09/17														
d.4.2	Escomesa "Ecoenergies" edifici Generalitat carrer Foc-Urani	11/07/17	25/08/17														
<b>d.5</b>	<b>SANEJAMENT</b>																
d.5.1	Reparació de la claveguera del carrer Josep Tarradellas entre Rosselló i Còrsega	03/07/17	31/08/17														
d.5.2	Reparació de la claveguera de Travessera de Gràcia entre plaça de Gal·la Plàcidia i carrer Gran de Gràcia	03/07/17	11/08/17														
d.5.3.a	Reparació punt baix Josep Anselm Clavé i Pg.Colom (Portal de la Pau)	10/07/17	28/07/17														
d.5.3.b	Reparació en reixes enfonsades en vial d'incorporació Rda. Del Mig (Carrer Sants sentit muntanya)	31/07/17	18/08/17														
d.5.4	Reparació claveguera Rasos de Peguera (Agudes - Antic Camp de Fútbol Ciutat Meridiana)	04/07/17	11/08/17														
<b>d.6</b>	<b>ACTUACIONS COORDINADES DE SERVEIS</b>																
d.6.1	Can Batlló																





## **D.1 Infraestructures elèctriques**

---



## PROMOTOR

## DISTRICTE

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

El traçat de la línia comença a una cambra existent a l'av. Paral·lel a la calçada sentit mar a l'alçada del carrer Tapioles, creua l'av. Paral·lel i el c. Compte Borrell, fins a la vorera costat Besòs del c. Comte Borrell, i discorre per la vorera fins el mercat de Sant Antoni.




## ACTUACIÓ D'ESTIU

## AFFECTACIÓ A LA CIUTAT

Els treballs de connexió dels cables es programen el dia 15 d'agost de 2017.

**La reposició de l'aglomerat es farà el 19 d'agost.**



	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



#### **d.1.2 Estesa cable 25kW al Carrer Tànger vinculada desmantellament Estació Elèctrica Poblenou**



## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



## **D.2 Infraestructures d'aigua potable**







Inici	Obra d'estiu	Fi
-------	--------------	----


Obra implantada

[illegible]




### **d.2.2 Instal·lació de nova vàlvula de d-1100 a la canonada de d-1400 del carrer Providència**

<b>PROMOTOR</b>	AGBAR
<b>DISTRICTE</b>	GRÀCIA
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Execució de dues boques d'home de Ø700 al carrer Providència sobre la canonada de Ø1400 i la nova vàlvula situada al costat muntanya del creuament amb Torrent de l'Olla.
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	Execució de dues boques d'home de Ø700 al carrer Providència entre Vilafranca - Alzina i Verntallat – Verdi, sobre la canonada de Ø1400 i la nova vàlvula situada al costat muntanya del creuament amb Torrent de l'Olla. Es programen els treballs del <b>26 de juny al 28 de juliol del 2017</b> .
<b>AFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	<p>Els treballs es faran amb el tall del carrer Providència i de Torrent de l'Olla.</p> <p>El desviament durant el tall de Torrent de l'Olla serà per Bellver - Verdi – Robí. (Veure fitxa a.4)</p> <p>Es garantirà en tot moment l'accés als parkings existent habilitant el tram de Torrent de l'Olla entre Robí i Providència en atzucac.</p>

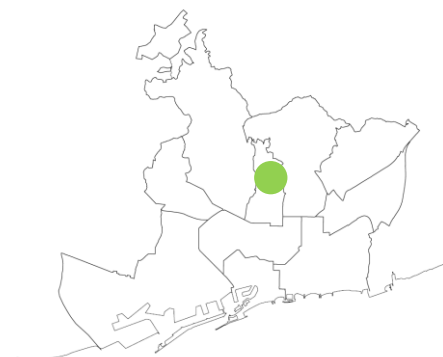

Inici	Obra d'estiu	Fi
-------	--------------	----

Obra implantada

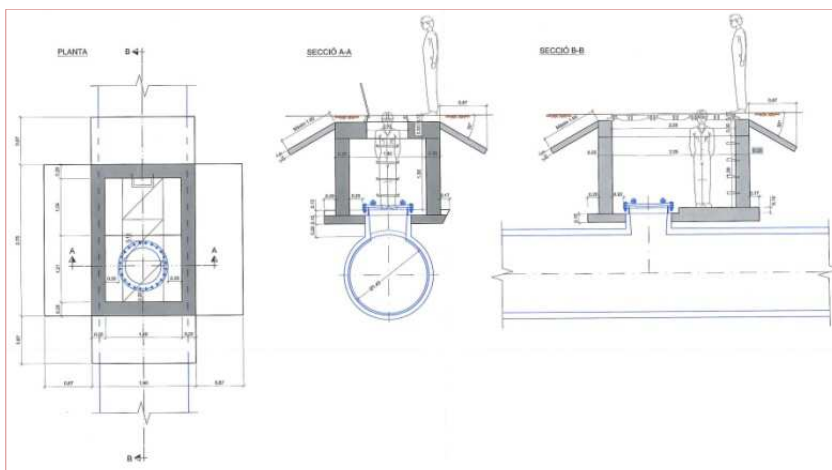

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]





**PROMOTOR**

AGBAR

## DISTRICTE

EIXAMPLE / SANTS – MONTJUÏC / LES CORTS / SARRIÀ – SANT GERVASI

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Diferents actuacions a la xarxa de distribució d'aigua potable:

Instal·lació de canonada d-200 al creuament de calçada d'Entença – av. Roma (Dte. Eixample)

Instal·lació de canonada d-150 al c. Numància 2 (Dte. Sants - Montjuïc)

Instal·lació de canonada d-150 al c. de la Maternitat (Dte. Les Corts)

Instal·lació de canonada d-150 al c. Anglí 48 (Dte. Sarrià - Sant Gervasi)

Instal·lació de canonada d-150 al c. Anglí 62 – 80 (Dte. Sarrià - Sant Gervasi)

## ACTUACIÓ D'ESTIU

Execució de canalització de canonada de la xarxa de distribució d'aigua potable.

## AFECTION A LA CIUTAT

Diferents afectacions segons ubicació.

[illegible]




## **D.3 Infraestructuras de gas**







PROMOTOR	GAS NATURAL
DISTRICTE	SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Substitució de la vàlvula de 16" de gas a la pl. Espanya a la vorera costat mar - Besòs de la plaça.
ACTUACIÓ D'ESTIU	<p>Els treballs consisteixen en l'execució de rasa al pou de vàlvules per la substitució dels equips instal·lats.</p> <p>També es realitzarà l'anul·lació de l'escomesa antiga de Fira Barcelona, s'eliminarà la trampilla existent i es col·locarà una nova vàlvula per garantir en tot moment el subministrament de Fira en cas d'urgència.</p>
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	<p>Es tancarà el recinte amb NJ de formigó i tanca rivisa amb malla d'ocultació per evitar vandalismes. Entre el recinte i l'accés de metro es mantindran 3m lliure de pas per a vianants.</p> <p>Es programa l'actuació del <b>26 de juny a l'11 d'agost del 2017</b> en un període amb el mínim impacte a les activitats de la Fira Barcelona.</p>

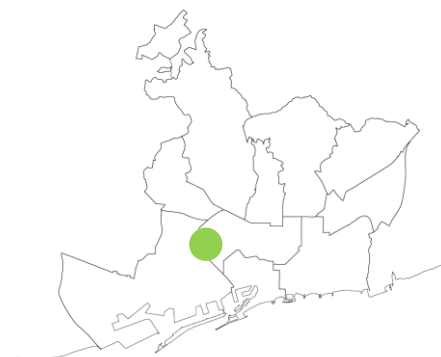

Inici	Obra d'estiu	Fi
-------	--------------	----

Obra implantada

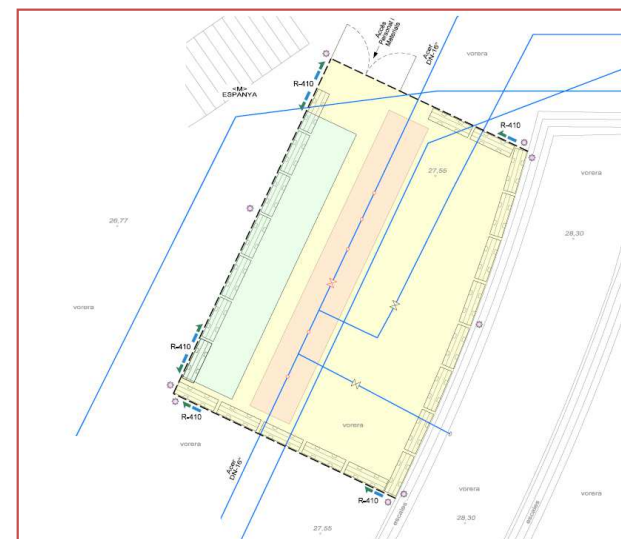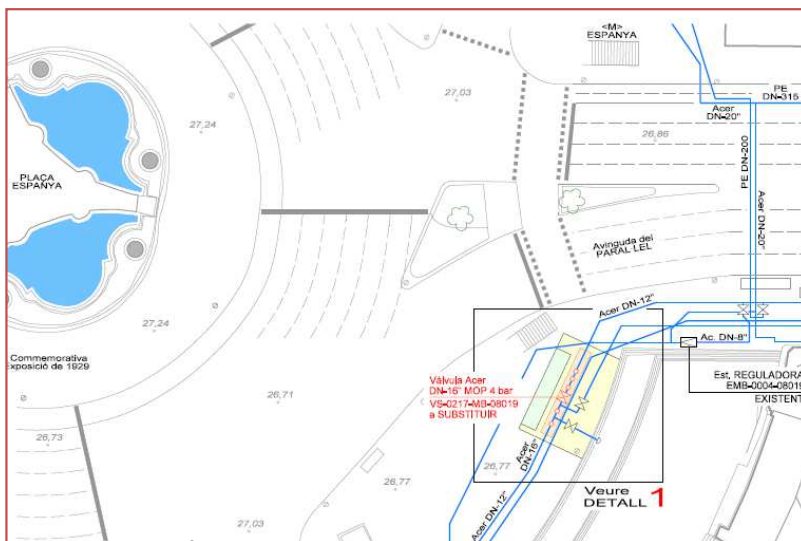

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



## **D.4 Infraestructures de climatització**





## PROMOTOR

## DISTRICLIMA

## DISTRICTE

## SANT MARTÍ

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Nova escomesa de la xarxa de Fred i Calor de Districlima al nou Tanatori de Sancho d'Àvila, situat al c. Almogàvers entre Zamora i Joan d'Àustria.

## ACTUACIÓ D'ESTIU

Els treballs es faran des de l'escomesa ja existent al carrer Almogàver amb Zamora, al costat muntanya - Besòs de la cruïlla i es connectarà amb el nou edifici.


Al tram del pont de l'Adif, al carrer Almogàvers, ja existeix un tram de la xarxa de Districlima que es va construir durant l'estiu del 2016 substituint una biga per una que incorporava la canalització de Districlima i altres serveis.

## AFECTION A LA CIUTAT

-S'ocuparà el costat muntanya del tram entre el carrer Zamora i l'accés a l'edifici, mantenint dos carrils de circulació pel costat mar del carrer.

-Es tallarà el carrer Zamora amb Almogàvers, mantenint Zamora en atzucac entre els carrers Sancho de Àvila i Almogàvers no afectant l'àrea blava existent en aquest tram de carrer.

- Serà necessari retirar l'estacionament del costat muntanya del c. Almogàvers.

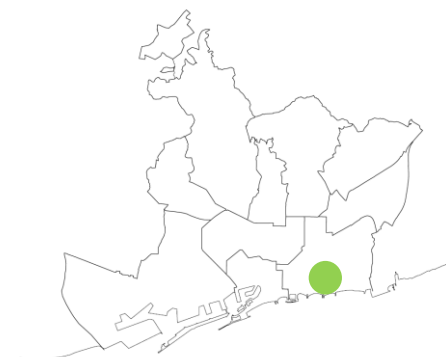

Inici

Obra d'estiu

Fi

**Obra implantada**


## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



Inici	Obra d'estiu	Fi
-------	--------------	----

PROMOTOR	ECOENERGIES
DISTRICTE	SANTS – MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Realització de canalització de 4 tubs preaïllants pel pas d'aigua freda i calenta per alimentar al nou edifici de la Generalitat al c. Foc amb c. Urani.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Execució de la canalització per alimentar el nou edifici aprofitant que es realitzarà un tall de la xarxa troncal, degut a les obres que s'han iniciat recentment en la continuació d'aquest carrer a l'altura del c. Metal·lúrgia.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Afectació calçada de Foc. <b>Del 11 de juliol al 11 d'agost</b> , mantenint un carril de circulació per sentit al costat mar. Afectació a la urbanització del costat muntanya de Foc. <b>Del 11 de juliol al 25 d'agost</b> , sense afectar a la mobilitat.

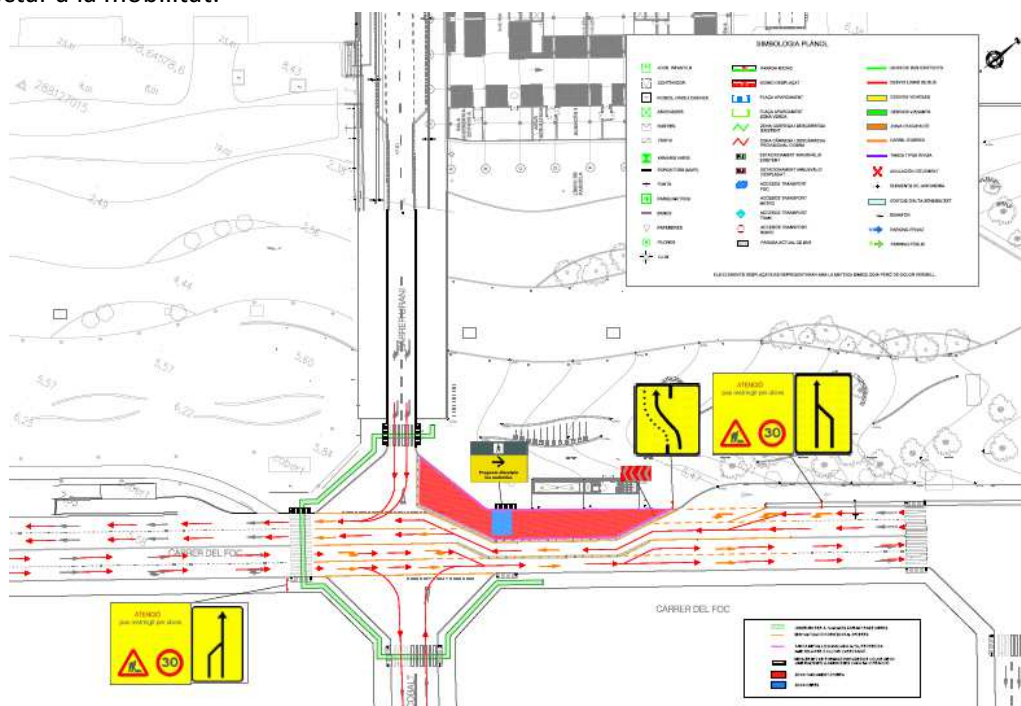[illegible]




## **D.5 Infraestructures de sanejament**





[illegible]

PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Reparació de la claveguera, actuant des de les tapes de registre, de la Trav. de Gràcia, entre la Via Augusta i el carrer Gran de Gràcia amb instal·lació de cubeta de gres. Es treballa obrint els pous del clavegueram en horari laborable (08h-15h)
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es programa l'actuació entre el <b>03 de juliol al 11 d'agost del 2017</b> , amb tall de carrers en horari laborable.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	<p><b>Fase 1a.</b> Tram de claveguera entre Gran de Gràcia i St. Cristòfol. Tall de St. Cristòfol a la cruïlla amb Sta. Eugènia, i tall de Trav. de Gràcia a la cruïlla amb Vic excepte accés als parkings. Filtratge de trànsit a Via Augusta. <b>(03/07/17 – 03/08/17)</b></p> <p><b>Fase 1b.</b> Tram de claveguera entre St. Cristòfol i St. Gabriel. Tall de St. Cristòfol a la cruïlla amb Sta. Eugènia excepte accés als parkings. Tall de Trav. de Gràcia a la cruïlla amb St. Gabriel. L'accés als parkings serà només per St. Cristòfol. Filtratge de trànsit a Via Augusta. <b>(04/08/17 – 11/08/17)</b></p>

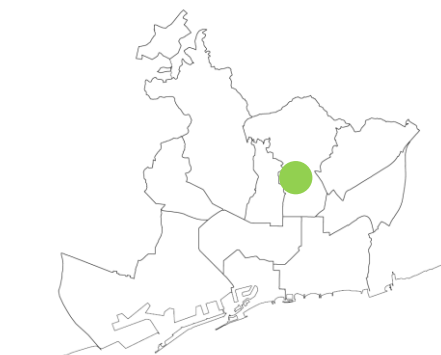


Inici

Obra d'estiu

Fi

### Àmbit d'obra

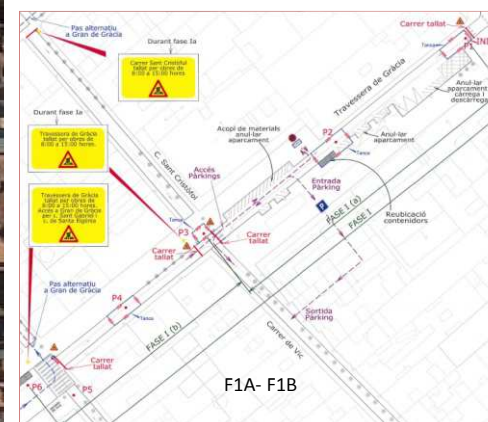

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]


[illegible]







<b>PROMOTOR</b>	AJUNTAMENT DE BARCELONA
<b>DISTRICTE</b>	NOU BARRIS
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Renovació de la claveguera en un tram on el diàmetre actual del col·lector de Ø250 provoca fets puntuals d'entrada en càrrega de la xarxa amb una nova claveguera que connectarà amb la claveguera ja existent de Ø600 a l'alçada de l'antic camp de futbol de Ciutat Meridiana per un costat i amb la del c. Agudes en l'altre costat.
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	Treballs consistents en la construcció d'una nova claveguera de Ø600 que uneix trams actuals i renovació de dos claveguerons. Es programa l'actuació entre el <b>04 de juliol a l'11 d'agost del 2017</b>
<b>AFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	Es programa l'actuació en tres fases: <b>Fase 1.</b> Treballs amb tall del carrer durant dos dies. <b>(04 al 05 de juliol)</b> <b>Fase 2.</b> Treballs en dues subfases mantenint un carril de circulació i retirant l'estacionament. <b>(06 de juliol al 09 d'agost)</b> <b>Fase 3.</b> Treballs amb tall del carrer durant dos dies. <b>(10-11 de juliol)</b> El desviament durant els dies de tall s farà sortint a la N-150 i la C17 i tornant a entrar al barri pel c. Rasos de Peguera

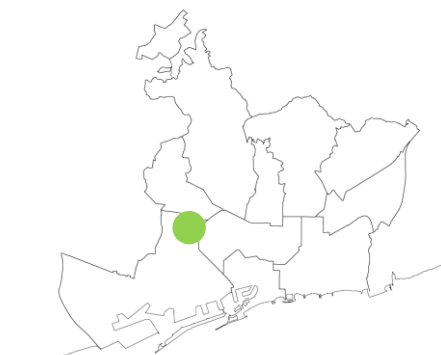

Inici

Obra d'estiu

Fi



## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ


[illegible]



## **D.6 Actuacions coordinades de serveis**






<b>PROMOTOR</b>	ENDESA – AGBAR – GAS NATURAL
<b>DISTRICTE</b>	SANTS - MONTJUÏC
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Instal·lació de 3 infraestructures per encabir nous subministraments polígon Batlló - Magòria. En total, el traçat té una longitud de 250 metres, configurat per un prisma formigonat de 3x3 tubs de 200mm per Endesa, un tub per CZ- Agbar i un tub per CZ - GNF
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	Treballs coordinats amb canalitzacions de ENDESA i de GAS NATURAL. -Coordinació amb ENDESA i GAS NATURAL des de Constitució fins Bertomeu Pi. -Coordinació amb ENDESA des de Bartomeu Pi fins a Gran Vía Corts Catalanes. -Instal·lació de Canonada d'Aigua a la calçada (per el carril d'aparcament costat Llobregat) de Ø150mm FD i elements hidràulics necessaris, al carrer de Amadeu Oller, per nous subministraments polígon Batlló - Magòria.
<b>AFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	Serà necessària l'ocupació del carril d'aparcament durant el període d'execució de les obres, mantenint el carril de circulació existent. Actuació pendent programar en el Comitè OM.

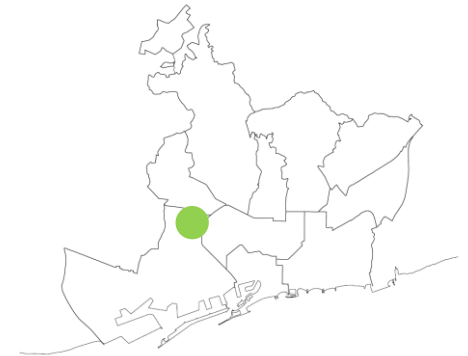

Inici

Obra d'estiu

Fi

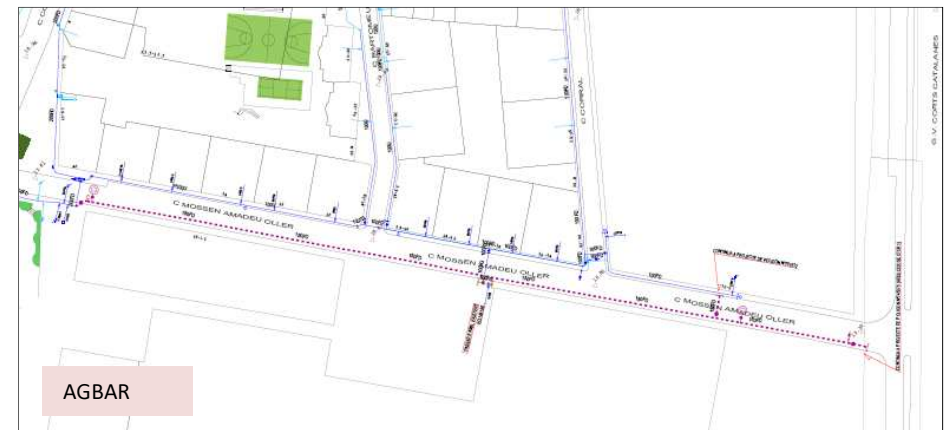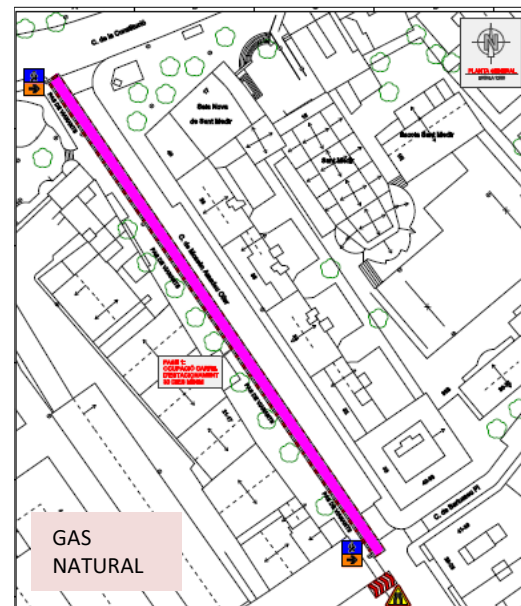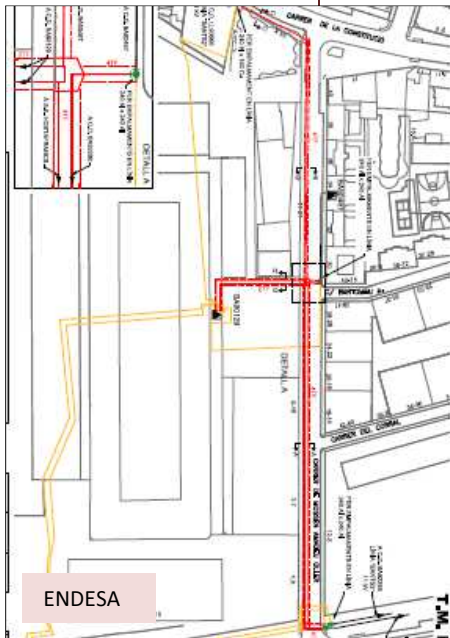

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Pendent aprovació al Comitè OM

Pendent aprovació al Comitè OM			JUNY		JULIOL				AGOST					SETEMBRE	
ACTUACIÓ	INICI	FINAL	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17
Can Batlló															



## **E. Actuacions en millores de la mobilitat**

---



## ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2017


e. ACTUACIONS EN MILLORA DE LA MOBILITAT				JUNY		JULIOL				AGOST				SETEMBRE				
ACTUACIÓ			INICI	FINAL	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17	11-17
e.1	EXECUCIÓ DE CARRILS BICICLETA (INICIAR TREBALLS)																	
e.1.1	Josep Carner	04/09/17	05/12/17															
e.1.2	París-Londres																	
e.1.3	Ganduxer																	
e.1.4	Doctor Fleming																	
e.1.5	Av. Pau Casals																	
e.1.6	Esteve Terrades																	
e.1.7	Rio de Janeiro																	
e.1.8	Dega Bahí																	
e.1.9	SAM Claret-Industria-Biscaia																	
e.1.10	Sardenya-Ramon Trias Fargas																	
e.1.11	Finalització carril bici Pujades - av. Meridiana (Pujades - Almogàvers)	09/12/16	31/07/17															
e.2	ACTUACIONS A LA XARXA DE BUS																	
e.2.1	València entre Navas de Tolosa i Espronceda	26/06/17	29/06/17															
e.2.2	Gran Via CC costat mar, entre Josep Pla i Rambla Prim	29/06/17	31/06/17															
e.2.3	Via Augusta (Trav. de Gràcia - av. Diagonal)																	
e.2.4	Pg. De Sant Joan (Trav. de Gràcia - Mallorca)																	
e.2.5	Millores de senyalització a la línea D20	03/07/17	08/09/17															
e.2.6	Implantació de nous carrils bus a Av. Meridiana (Fabra i Puig - Rio de Janeiro)																	
e.3	TALLS DE SERVEI DE LA XARXA FERROVIÀRIA																	
e.3.1	L1: servei Hospital de Bellvitge-Torres i Bages	31/07/17	31/08/17															
e.3.2	L3: servei Zona Universitària-Vall d'Hebron i Canyelles-Trinitat Nova	29/07/17	14/08/17															
e.3.3	L3: servei Zona Universitaria-Lesseps i Vall d'Hebron-Trinitat Nova	22/08/17	03/09/17															





## **E.1 Execució de carrils bicicleta**



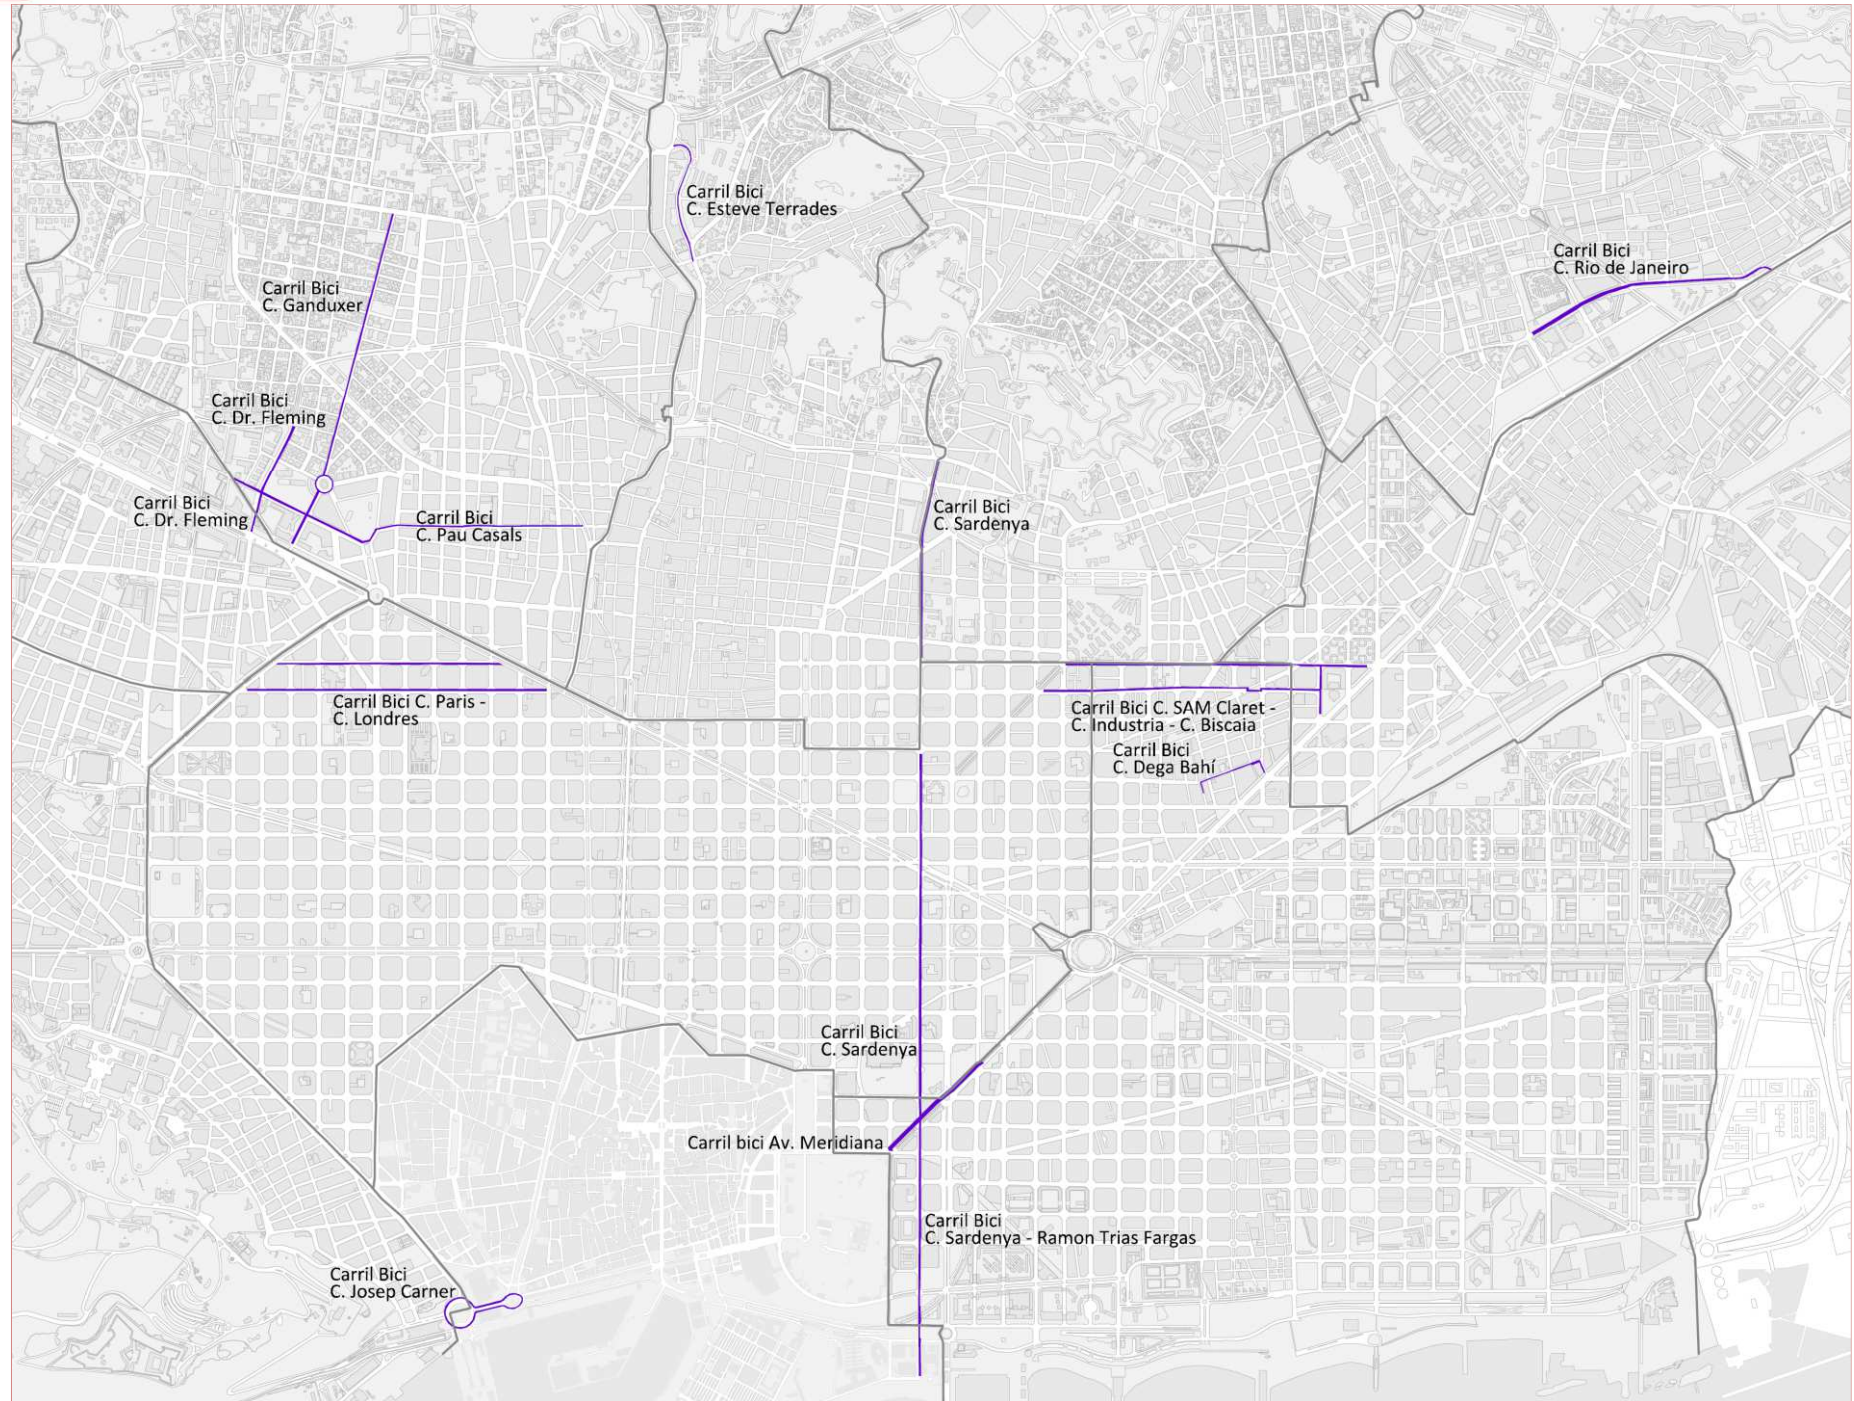

## PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

## DISTRICTE

## CIUTAT VELLA

## DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

La realització d'aquest carril bici preveu una sèrie d'actuacions que permetran :

- Donar continuïtat al carril bici que arriba de l'Av. Paral·lel cap a la zona del Pg. de Colom a través del Pg. de Josep Carner, amb la creació d'un carril bici central i un parterre enjardinat.
- Realitzar les sortides pendents de l'actual carril bici de la pl. de les Drassanes cap al pg. de Josep Carner costat Llobregat i el moll de Sant Bertran.
- Condicionar la sortida de la Ronda Litoral i els carrils de vehicles de la pl. de les Drassanes, per tal de protegir els carrils bici existents i projectats.
- Endreçar l'entrega dels carrils bici provinents del pg. de Colom a la seva arribada a la pl. del Portal de la Pau.

## ACTUACIÓ D'ESTIU


Ocupar el carril ràpid del costat muntanya per ubicar un carril bici de doble sentit de circulació amb la secció següent:

- Tres carrils de circulació exteriors de 380+370+370.
- Un carril bici de doble sentit de circulació de 250cm (120+10+120).

## AFECTACIÓ A LA CIUTAT


El Comitè OM aprova:

- Fase 1: adaptació del pas de vianants i de bicicletes del costat Besòs de la pl. Portal de la Pau en subfases, habilitant un pas provisional al costat Besòs del mateix i mantenint en tot moment un carril de circulació en cadascuna de les calçades del pg. Colom.
- Fase 2: execució de la jardinera central al c. Josep Carner segregant la circulació del carril bici bidireccional.

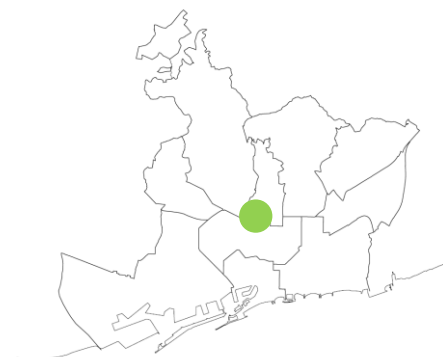

Inici Obra d'estiu

Fi

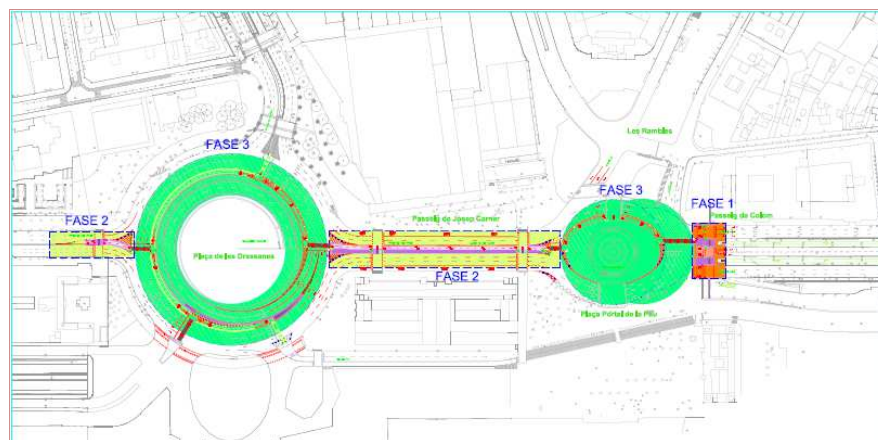


## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



<b>PROMOTOR</b>	AJUNTAMENT DE BARCELONA
<b>DISTRICTE</b>	CIUTAT VELLA
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Implantació i millora del carril bicicleta al passeig Pujades entre c. Comerç i av. Meridiana, carrer Pujades entre av. Meridiana i Marina, av. Meridiana entre Pujades i Marina i la cruïlla de l'av. Meridiana amb Sancho d'Àvila
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	<p>Treballs fase 3, a desenvolupar a av. Meridiana i a la cruïlla av. Meridiana - Sancho d'Àvila, consistents en :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Implantació de nou carril bici (senyalització horitzontal i separadors) al carril esquerre del lateral de la Meridiana (Pujades - Almogàvers sentit muntanya)</li> <li>-Col·locació de separadors al carril esquerre del lateral de la Meridiana (Pujades - Almogàvers sentit mar)</li> <li>-Adequació de la cruïlla de Meridiana / Sancho d'Àvila / Lepant.</li> </ul>
<b>AFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tall del lateral i feines en horari nocturn durant una nit.</li> <li>-Ocupació del carril esquerre dels laterals.</li> <li>-Senyalització horitzontal a cruïlles durant dues nits per meitats de calçada.</li> <li>-Creuaments per adequació de la xarxa semafòrica: del TRAM en horari nocturn amb pilot.</li> </ul>

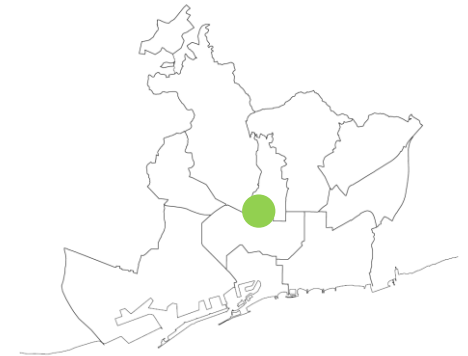


Inici

Obra d'estiu Fi

Obra implantada

Foto tram pràcticament finalitzat c. Pujades.  
Pendent jardineria i enllumenat

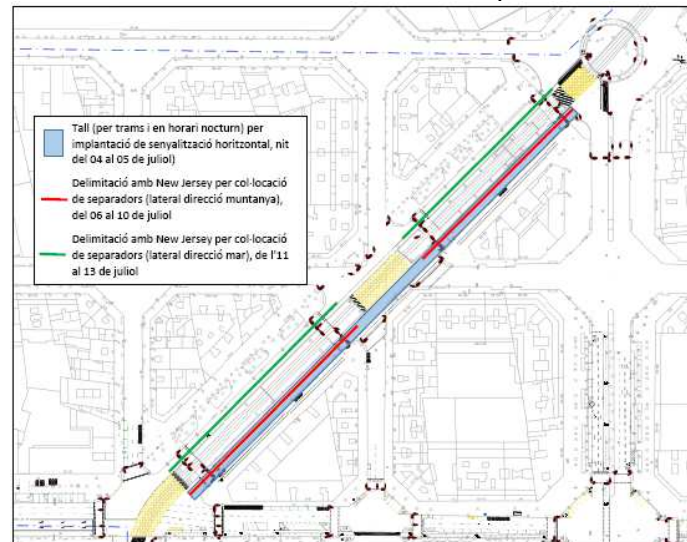

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



## **E.2 Actuacions a la xarxa de bus**








### e.2.2 Gran Via CC costat mar, entre Josep Pla i Rambla Prim

Inici	Obra d'estiu	Fi
-------	--------------	----



**FINALITZADA**[illegible]



<b>PROMOTOR</b>	AJUNTAMENT DE BARCELONA
<b>DISTRICTE</b>	EIXAMPLE / SARRIÀ – SANT GERVASI / GRÀCIA
<b>DESCRIPCIÓ DE L'OBRA</b>	Treballs d'implantació de nous trams de carril bus a Via Augusta (entre Travessera de Gràcia i Comte de Salvatierra), i al pg. de Sant Joan, (entre Travessera de Gràcia - Sant Antoni M. Claret i Còrsega - Provença en el sentit descendent; entre av. Diagonal - Rosselló i Indústria - Travessera de Gràcia en sentit ascendent)
<b>ACTUACIÓ D'ESTIU</b>	Els treballs consisteixen en la modificació de la senyalització horitzontal i vertical als dos trams de carrer.
<b>AFECTACIÓ A LA CIUTAT</b>	Actuacions pendent de programar

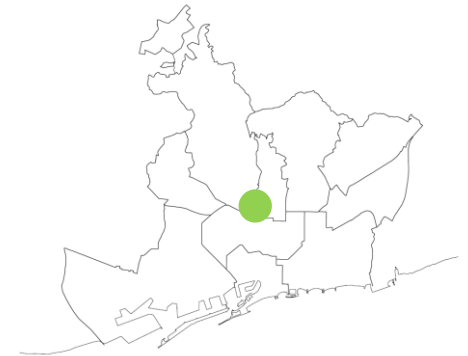

Inici Obra d'estiu Fi

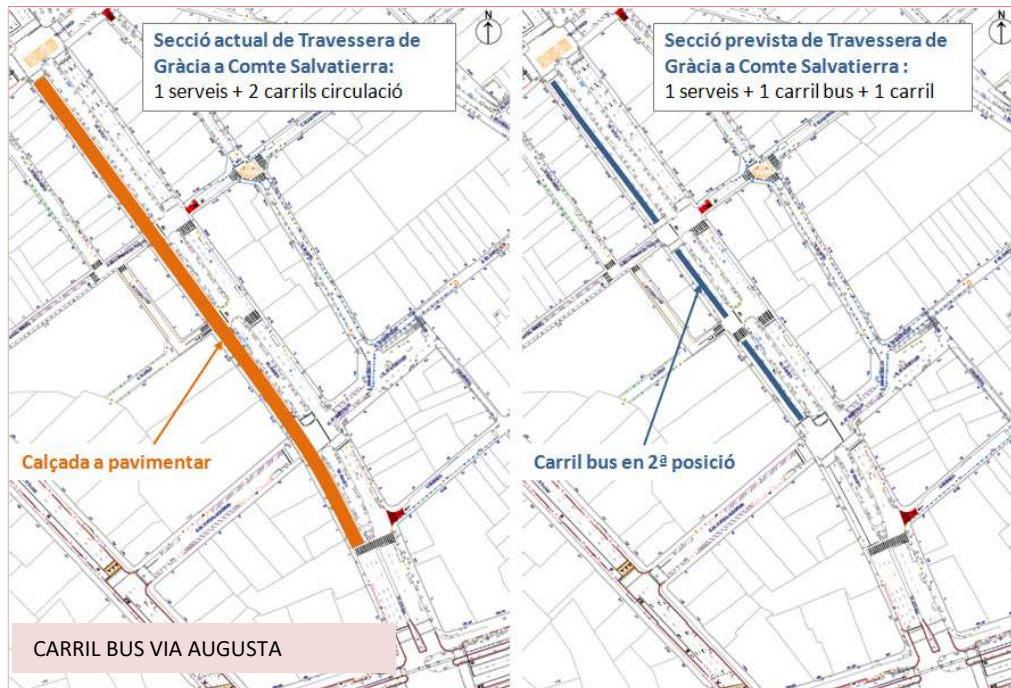





PROMOTOR


DISTRICTE

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

INFRASTRUCTURES

CIUTAT

- Millora a les parades
- Millora a la senyalització horitzontal
- Ajustos de regulació semafòrica

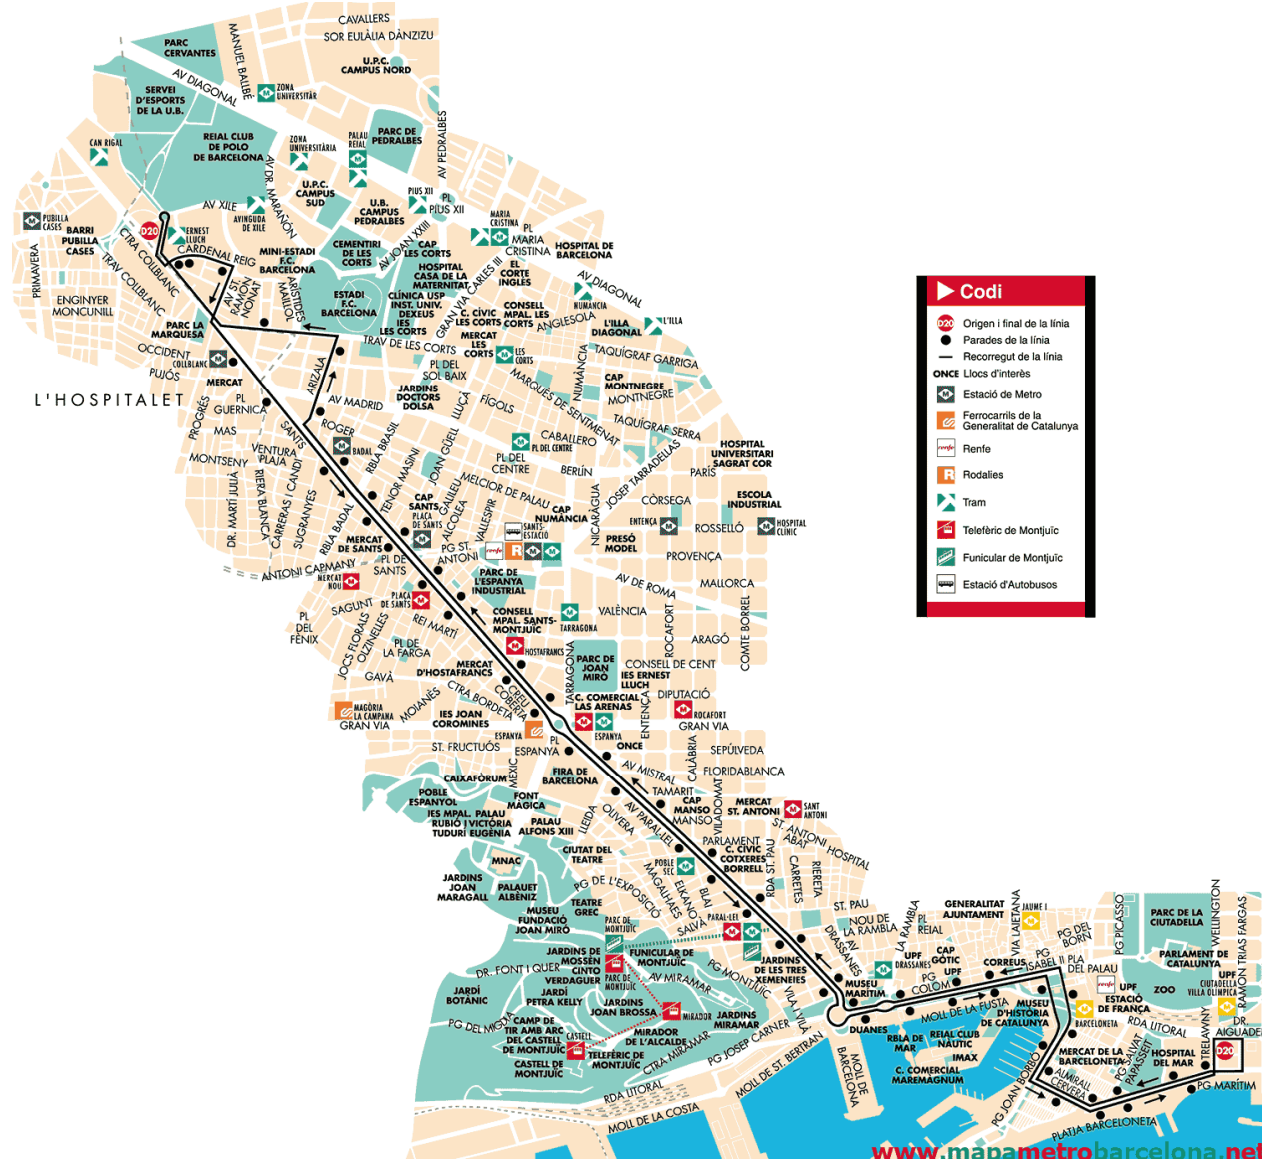



## **E.3 Talls de servei de la xarxa ferroviària**





PROMOTOR

TMB

DISTRICTE

CIUTAT

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Talls de servei de la xarxa ferroviària previst per l'estiu 2017:

L1: servei Hospital de Bellvitge - Torres I Bages (31/07/17 – 31/08/17)

L3: servei Zona Universitària - Vall d'Hebron i Canyelles - Trinitat Nova (29/07/17 – 14/08/17)


L3: servei Zona Universitària - Lesseps i Vall d'Hebron - Trinitat Nova (22/08/17 – 03/09/17)



31/07/17 – 31/08/17



29/07/17 – 14/08/17

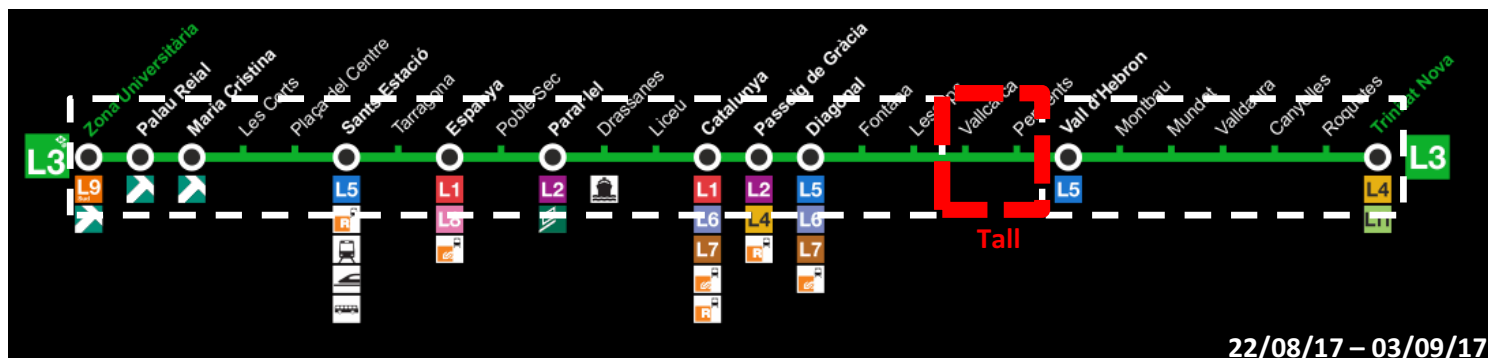

22/08/17 – 03/09/17





## **F. Actuacions d'iniciativa privada**





**ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2017**

f. ACTUACIONS D'INICIATIVA PRIVADA				JUNY		JULIOL				AGOST				SETEMBRE		
	ACTUACIÓ	INICI	FINAL	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17
f.1	Execució de pou d'accés en calçada a la mina d'aigua situada al carrer Còrsega 344-352 (Núñez i Navarro)	03/07/17	31/07/17													
f.2	Instal·lació de grua de gran tonatge (400T) a Gran Via CC 553, cruïlla amb Casanova (La casa por el Tejado)	Pendent														
f.3	Instal·lació de grua de gran tonatge (400T) a Gran Via CC 504, cruïlla amb Comte Borrell (La casa por el Tejado)	Pendent														



(Núñez i Navarro)

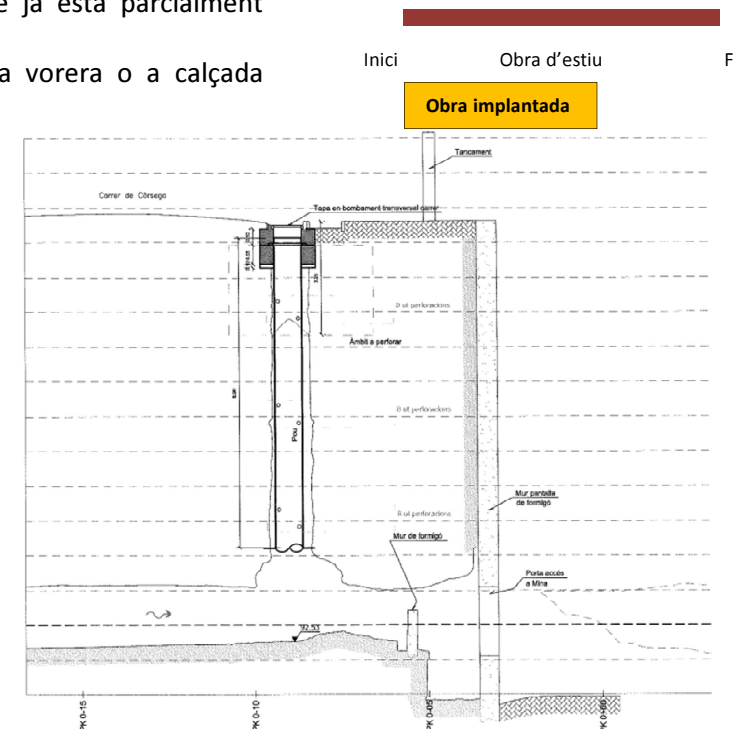

## CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



**Ajuntament  
de Barcelona**

**B**

**C**
